



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Ocoyoacac, México, a 08 de julio de 2020
Oficio No. 210C3101A000000/379/2020

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado doctor Isaías:

En atención al oficio número 511/2020.-0845-24 de fecha 13 de febrero de 2020, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria, así como al Tercer Comunicado a Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales CONTINGENCIA-COVID 19, de fecha 27 de abril de 2020, remito a usted **Segundo Informe Trimestral** (periodo de abril-junio) del reporte de avance físico y financiero de la obra: **Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac**, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2020.

Dicho reporte se envió en formato digital (PDF y Excel) a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

CCP. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.
Lic. Jaime Chapa Benítez, Director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Mtra. Blanca Miriam González Garduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT.
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT.
Archivo.
OPS/ABHC

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0344F

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo
 Cargo: Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
 Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1040 y 1041
 Correo electrónico: uippe@unext.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Blanca Miriam González Garduño
 Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa.
 Teléfono: 01 728 287 83 82; ext. 1120 y 1121
 Correo electrónico: direccionadministrativa@unext.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC	X					\$ 19,048,822.00	\$ -	\$ -						0%	N/D	N/D	En fecha 21 de mayo de 2020, se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional de Obra por Encargo para la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" DE DOCENCIA (LABORATORIOS) UNEVT PLANTEL OCOYOACAC (PRIMERA ETAPA) con número de registro IMIFE/DCU001/2020. En fecha 26 de junio de 2020, se publicó en los periódicos EL UNIVERSAL y EL GRÁFICO la convocatoria pública No. 002, para la adjudicación de la obra. En espera de los resultados de la empresa contratada.						
							\$19,048,822.00	\$0.00	\$0.00	TOTAL	0	0.00												

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
 RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZALEZ GADUÑO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

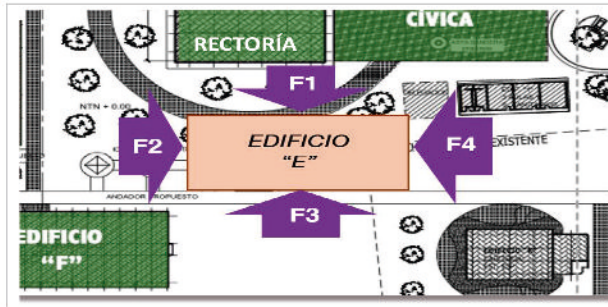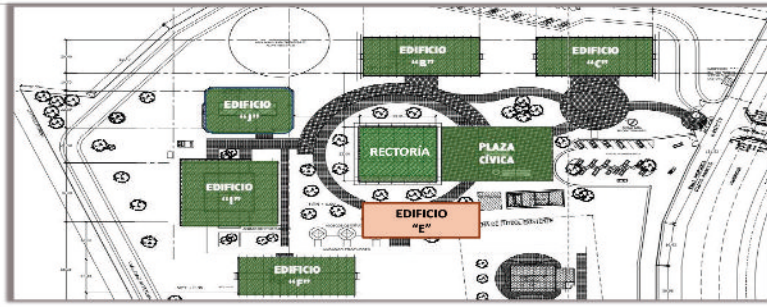

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Lateral

F3: Fachada posterior

F4: Lateral

F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZALEZ GADUÑO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
