



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RECIBIDO
15.70
15 ABR 2019
E. M. Torres



EDOMEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

*2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Estado de México.
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

A/R

Ocoyoacac, México, a 15 de abril de 2019
Oficio No. 210C3101A0000007318/2019

Universidad Estatal del Valle de Toluca
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
15 ABR 2019
Departamento de Recursos
Materiales Financieros
Recepción

DR. ISAIAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE

Por este conducto, me permito remitir a usted un CD, con el formato de reporte de avance físico y financiero de la obra "Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría" del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, correspondiente al mes de marzo del 2019; asimismo, le informo que dicho reporte se envió en formato digital a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx; anexando dos archivos (PDF y Excel).

En relación al reporte de informe correspondiente al FAM ejercicio 2018, me permito informarle que a la fecha el monto ejercido es de cero pesos, no obstante le comunico que esta Universidad se encuentra en coordinación con el departamento de Infraestructura Física Educativa de su Institución, para gestionar la reconducción del recurso asignado al ejercicio fiscal en comento, el cual será aplicado en la Clínica Integral Universitaria de la UNEVT, el cual contempla adecuaciones, mejoras, trabajos de mantenimiento y equipamiento de la misma, lo anterior derivado de las necesidades propias de esta Casa de Estudios, por lo que una vez autorizado, se enviará el reporte de avance que corresponde.

Universidad Estatal del Valle de Toluca
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
13 ABR 2019
Planeación, Evaluación y Seguimiento
UNEVT

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

15.70
SEP.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
11 ABR 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

- CCP. DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA - DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP.
- LIC. JAIME CHAPA BENÍTEZ - DIRECTOR DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
- C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES - DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UNEVT.
- DR. CRISTINO REYES BANDALA - JEFE DE LA UNIDAD DE LA UNEVT.

ACQUINO
OPS/CRB/abhc

Universidad Estatal del Valle de Toluca
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
12 ABR 2019
Dirección Administrativa

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
MARZO 2019
FECHA DE CORTE: 29/03/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0944F

Planeación

Nombre: MTI. Cristino Reyes Bandala
Cargo: Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: 01 726 287 83 Ext. 1040 y 1150
Correo electrónico: uippe@unevt.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: C. Guillermina San Martín Castroparedes
Cargo: Directora Administrativa
Teléfono: 01 726 287 83 Ext. 1120 y 1121
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avances	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adornamientos y mobiliario	Mantenimiento				Proyecto sustancial	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)
1	Finalización de la construcción del edificio de Rectoría	X				\$ 10,553,214.67	\$ 10,533,340.94	\$ 19,873.73	Estructura	122288												
									Albañilería	14450												
									Acabados	11608												
									Impermeabilización	4431												
									Canselaría y aluminio	723												
									Ins. Eléctrica	347												
									Señalización	1												
									Red eléctrica	7130												
									TOTAL	1	160977											
						\$10,553,214.67	\$10,533,340.94	\$19,873.73														

[Handwritten signature and stamp area]

MIRA OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

[Handwritten signature]
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
MARZO_2019
FECHA DE CORTE: 29/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

99%

1 Nombre de la obra: **Finalización de la construcción del edificio de rectoría**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

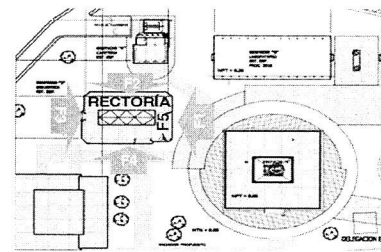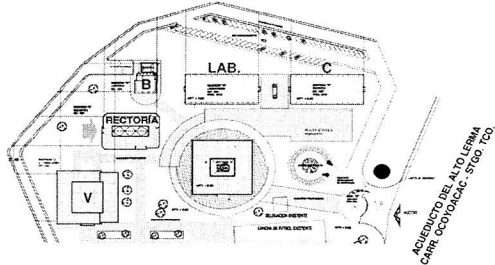


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de Mexico. C.P. 52756.

FOTOS

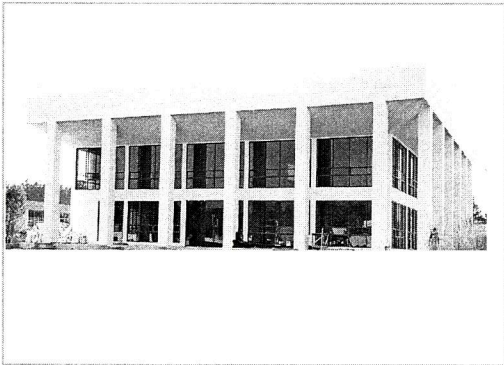


F1: Fachada principal

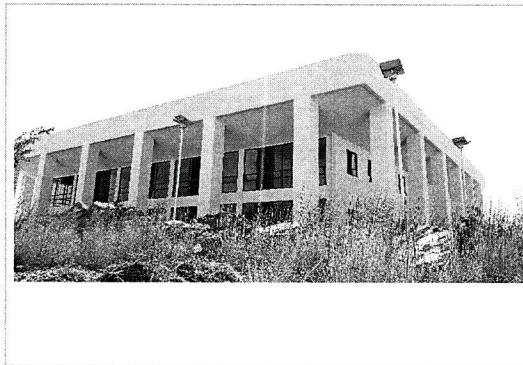


F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Avance de los trabajos de rampas y andadores:

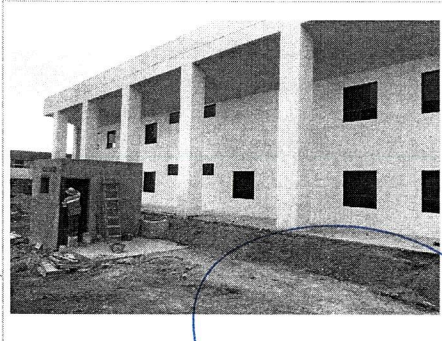

F3: Fachada posterior

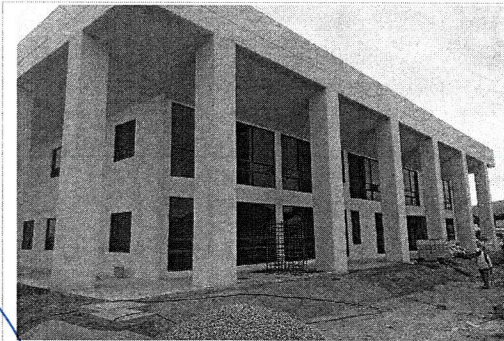

F4: Lateral



F5: Interior de aula

[Handwritten signature]
MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

[Handwritten signature]
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
