



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

Ocoyoacac, México, a 08 de enero de 2019
Oficio No. 205BP1A000/6/2019

ALB
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE

Por este conducto, me permito remitir a usted, formato de avance físico y financiero de la obra "Finalización de la construcción del edificio de Rectoría" del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, correspondiente al mes de diciembre del 2018; asimismo, se hace entrega de manera física de un CD, con el archivo en comento.

Cabe hacer mención que dicho reporte se envió en formato digital a los correos: isaías.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx; anexando dos archivos (PDF y Excel).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RAMÓN MANZO VARGAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA
DE LA UNEVT



S. E. P. *Anexos y CD.*
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
31 ENE 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

CCP. DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA - DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP.
CPC. HORACIO DÍAZ MORA - DIRECTOR DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
MTI. CRISTINO REYES BANDALA - JEFE DE LA UIPPE.
ARCHIVO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

Diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0944F

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: MTL. Cristino Reyes Bandala
Cargo: Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: 01 728 287 83 Ext. 1040 y 1150
Correo electrónico: uippe@unevt.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C. Guillermina San Martín Castroparedes
Cargo: Directora Administrativa.
Teléfono: 01 728 287 83 Ext. 1120 y 1121
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguro?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Finalización de la construcción del edificio de Rectoría	X					\$ 10,553,214.67	\$ 3,165,516.05	\$ 7,387,698.62	Estructura	122288						08/10/18	N/D	Se ha suscrito el contrato número IMIFE-1490-CC-L2018 para los trabajos de la Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría, los cuales se encuentran en proceso de ejecución.				
										Albañilería	14450												
										Acabados	11608												
										Impermeabilización	4431												
										Cancelería y aluminio	723												
										Ins. Eléctrica	347												
										Señalización	1												
										Red eléctrica	7130												
										TOTAL	1	160977											
							\$10,553,214.67	\$3,165,516.05	\$7,387,698.62														

LIC. JOSÉ RAMÓN MANZO VARGAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA DE LA UNEVT

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado:
Diciembre_2018
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNEVT



Porcentaje de avance

30%

1

Nombre de la obra: **Finalización de la construcción del edificio de rectoría**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

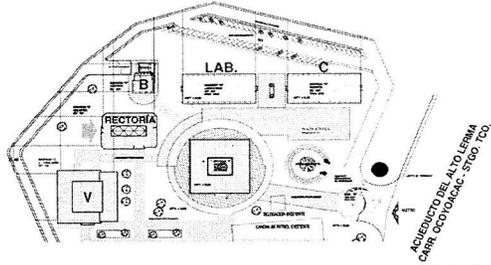

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756

FOTOS

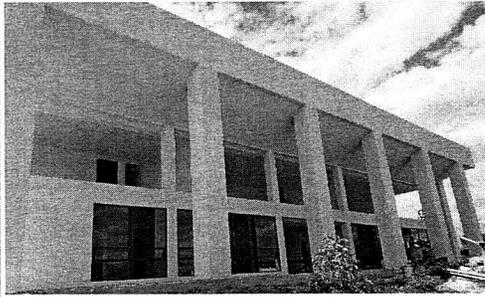

F1: Fachada principal



F2: lateral




F3: Fachada posterior



F4: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

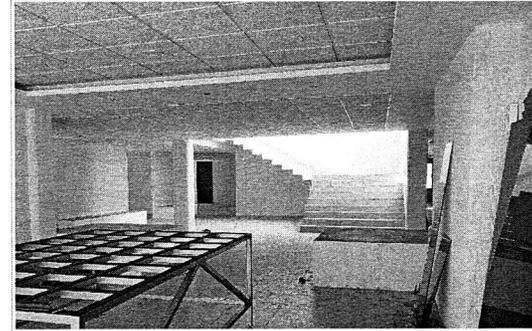

F5: Interior de aula

LIC. JOSÉ RAMÓN MANZO VARGAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA DE LA UNEVT

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
