



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

A/R

Ocoyoacac, México, a 07 de marzo de 2019
Oficio No. 210C3101A000000/219/2019

DR. ISAIAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE

Por este conducto, me permito remitir a usted, formato de avance físico y financiero de la obra "Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría" del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, correspondiente al mes de febrero del 2019; asimismo, se hace entrega de manera física de un CD, con el archivo en comento.

Cabe hacer mención que dicho reporte se envió en formato digital a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx; anexando dos archivos (PDF y Excel).

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
14:39
15 MAR 2019
E. M. Alvarado
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
14:49
15 MAR. 2019
Isma V.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

S.E.P. 14:36
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
15 MAR 2019
COPICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

CCP. DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA - DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP.
CPC. HORACIO DÍAZ MORA - DIRECTOR DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTRO PAREDES - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
M. CRISTINO REYES BANDALAJA JEFE DE LA OFICINA

OPS/CAB/labhc



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
FEBRERO_2019
FOLIO DE CONTROL: 28-02-2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**

Entidad federativa: **Estado de México**

Clave Inst 911: **13MSLU944F**

Planeación
Nombre: **MTI Ciro Reyes Bardsis**
Cargo: **Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación**
Teléfono: **01 726 287 83 82 Ext. 1040 y 1150**
Correo electrónico: **vipoo@unevt.edu.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: **C. Guillermina San Martín Castroparedes**
Cargo: **Directora Administrativa**
Teléfono: **01 726 287 83 82; ext 1125 y 1121**
Correo electrónico: **direccionadministrativa@unevt.edu.mx**



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA					
						Estructuras	cantidad	Metros cuadrados				¿Exhaustivo de se inaugurado? (Cuenta)	¿Cuánto con fotos del evento?		¿Cuándo cuánto inauguró?	Entrega Recepción (Acto Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Finalización de la construcción del edificio de Rectoría	X	\$ 10,553,214.67	\$ 4,459,383.14	\$ 6,093,831.53	Estructura	122286				43%	06/10/18	15/03/19	Se han solicitado las estimaciones de pago ante el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.						
						Albanilería		14450												
						Acabados		11628												
						Impermeabilización		4431												
						Carpintería y aluminio		723												
						Ins. Eléctrica		347												
						Señalización		1												
						Red eléctrica		7130												
						TOTAL		1	166977											
			\$10,553,214.67	\$4,459,383.14	\$6,093,831.53															

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

1 Se explorara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en sec dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PORTALEAMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

FEBRERO 2019

FEBRERO CONTI 2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

43%

1 Nombre de la obra: Finalización de la construcción del edificio de rectoría

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Leiría No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Goyoacac, Estado de México. C.P. 52756.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



Comentarios de los trabajos realizados:

Avance de los trabajos de rampas y andadores:

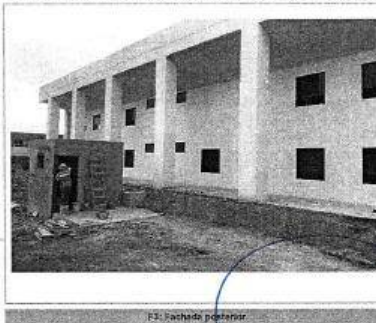

F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de obra

[Handwritten signature]
MTRA. OLGA PÉREZ SÁNCHEZ
RECTORA

[Handwritten signature]
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
