



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

Ocoyoacac, México, a 09 de agosto de 2019.  
Oficio No. 210C3101A000000/709/2019.

**AIR**

**DR. ISAIAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**PRESENTE**

Por este conducto, me permito remitir a usted en CD, con los formatos de reporte de avance físico y financiero del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 y 2019, correspondiente al mes de julio del presente año.

No omito mencionar que, dichos reportes se enviaron en formato digital a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx; anexando dos archivos (PDF y Excel).

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA



c.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP.  
Lic. Jaime Chapa Benítez.- Director de Subsidio a Universidades de la DGESU de la SEP.  
Mtra. Blanca Miriam González Garduño.- Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT.  
Ing. Ana Belen Hernández Castillo.- Encargada de la UIPPE de la UNEVT

Archivo OPS/AMC



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDADES ESTATALES DEL VALLE DE TOLUCA

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**JULIO\_2019**  
FECHA DE DEPORTE: 21/07/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



UNEVT

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0944F

**Planeación**

Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo  
Cargo: Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
Teléfono: 01 728 287 83 Ext. 1040 y 1041  
Correo electrónico: uippe@unevt.edu.mx

**RESPONSABLES**

**Obras y Mantenimiento**

Nombre: Mtra. Blanca Miriam González Garduño  
Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa.  
Teléfono: 01 728 287 83 Ext. 1120 y 1121  
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Derechos de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Iniquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Proyecto de equipamiento para espacios educativos, laboratorios y de la clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	X				\$ 6,427,738.18	\$ -	\$ -	Aulas/salones	42	8400 m2													
2	Proyecto de adecuaciones y mejoramiento de espacios teórico-prácticos de la Universidad, que contribuya a optimizar y potencializar su funcionamiento.		X			\$ 5,445,840.47	\$ -	\$ -	Aulas interactivas	8	1600 m2													
3	Proyecto de mantenimiento institucional en espacios educativos, laboratorios y de clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.			X		\$ 4,842,995.02	\$ -	\$ -	Aulas magnas	1	200 m2													
									<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>42,800 m2</b>													
						\$ 16,716,373.67	\$ 0.00	\$ 0.00																

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotografico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**JULIO\_2019**  
FECHA DE CORTE: 21/07/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



1 Nombre del proyecto: **Equipamiento para espacios educativos, laboratorios y de la clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.**



Porcentaje de avances

**0%**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Cal. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52766.


FOTOS




AULAS

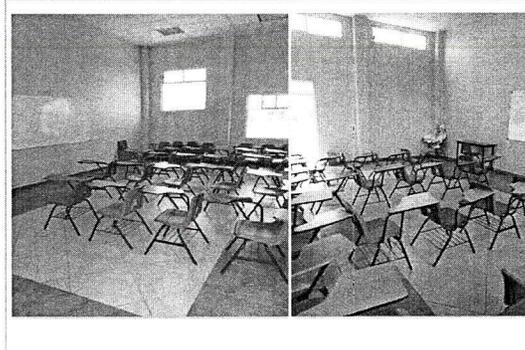


LABORATORIO MULTISENSORIAL

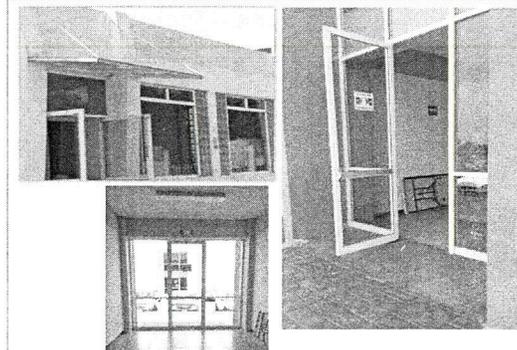


PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA (CIU, EDIFICIO "C" Y "F")

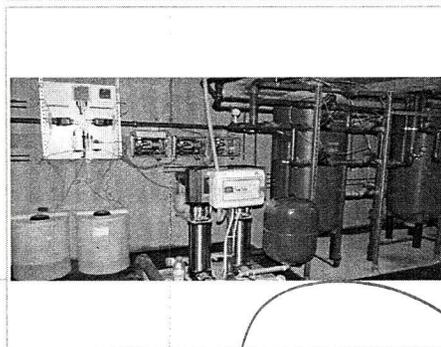

SISTEMA ELÉCTRICO EN CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA

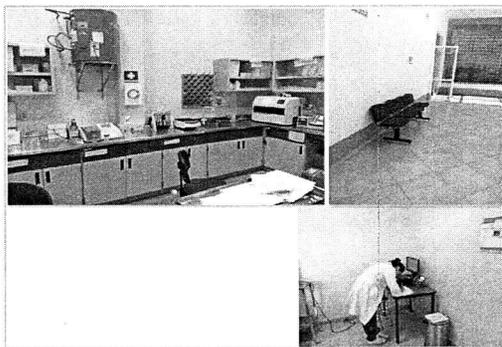

LABORATORIO CLÍNICO

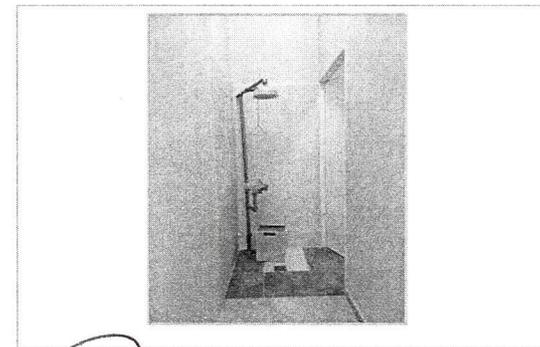

REGADERA DE EMERGENCIA EN CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA

MTRA. OLGA PÉREZ-SANABRIA  
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GADUÑO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FMS

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes Reportorio

**JULIO 2019**

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre del proyecto: **Adecuaciones y mejoramiento de espacios teórico-prácticos de la Universidad, que contribuya a optimizar y potencializar su funcionamiento.**




UNEVT


Porcentaje de avances

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

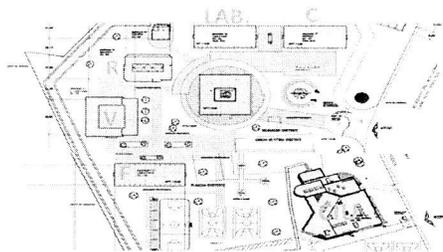


CIU




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.


FOTOS

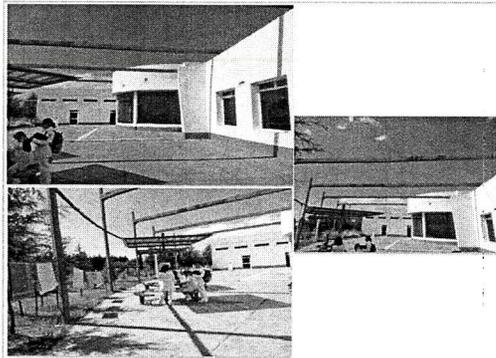


ADECUACIÓN DE AREA DE OI-GONG




LABORATORIO DE ESTIMULACIÓN TUI-NA MULTISENSORIAL

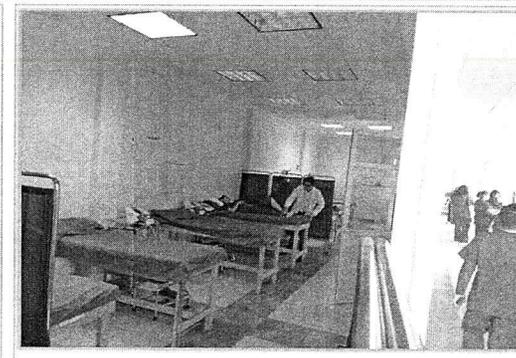


ÁREA DE ELECTRO-ACUPUNTURA

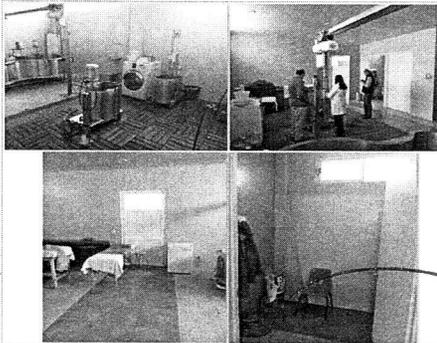

ÁREA DE HIDROTERAPIA



LABORATORIO CLÍNICO



ÁREA DE ESPERA Y ADMISIÓN

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZALEZ GADIRIO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

ARG

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**JULIO 2019**  
FECHA DE CORTE: 31/07/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





UNEVT

Porcentaje de avance

0%

3 Nombre de los proyectos: **Mantenimiento institucional en espacios educativos, laboratorios y de clínica Integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.


FOTOS

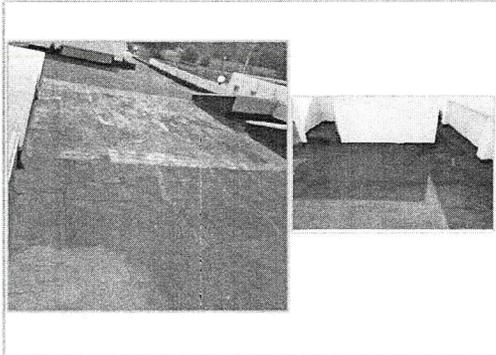


Impermeabilización (techo de la CIU)

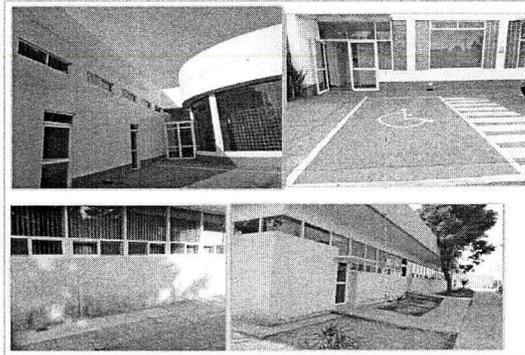


Trabajos de Pintura (CIU y edificio de Vinculación interior y exterior)

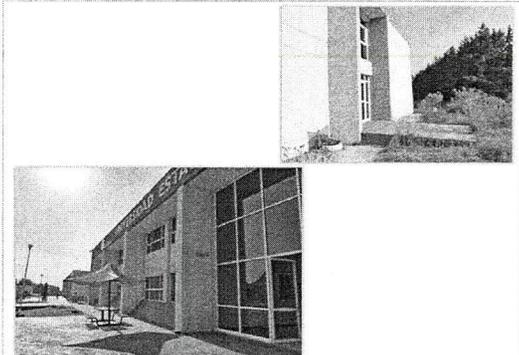

Trabajos de Pintura (edificio "C" y "F")

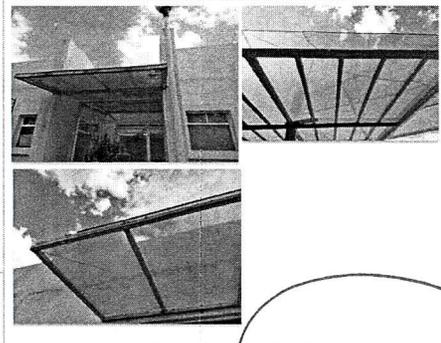

MANTENIMIENTO A CANCELERÍA EN CIU

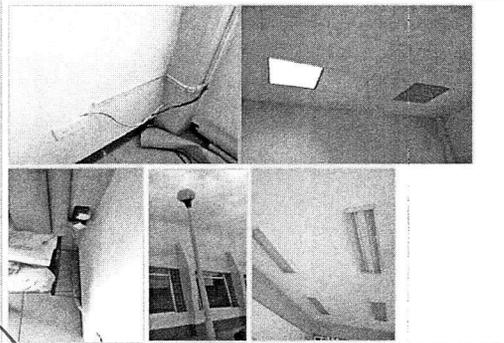

Instalación eléctrica e iluminación (Edificios "C", "F", Vinculación, Laboratorios, Biblioteca)

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GADUÑO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
