



Ocoyoacac, México, a 26 de mayo de 2021
Oficio No. 210C3101A000000/244/2021

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado doctor Isaías:


En relación a la obra Construcción Edificio "E" de Docencia (laboratorios) UNEVT Plantel Ocoyoacac, apoyada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2020, informo a usted que se concluyeron los trabajos de ejecución de acuerdo a los siguientes datos:

| Monto Autorizado | Monto Ejercido | Remanente | Avance físico | Fecha de inicio | Fecha de término |
|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| \$19,048,822.00 | \$19,047,450.07 | \$1,371.93 | 100% | 07/08/2020 | 31/12/2021 |

En este sentido, remito formato de reporte de finalización física y financiera. Asimismo, hago de su conocimiento que en fecha 12 de abril del año en curso, se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE por un monto de \$139,242.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos cuarenta y dos 00/100 m.n.) por concepto de rendimientos y remanentes no ejercidos, por lo que adjunto copia de línea de captura, formato Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) y comprobante de pago.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

CORDIALMENTE



MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA



C.c.p. Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
 Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
 Lic. Rodrigo Villa Monroy, Director Administrativo.
 Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT.
 Mtro. Alejandro Esquivel Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros.
 OPS/ABHC/jchn

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados:
OCTUBRE-DICIEMBRE
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



UNEVI

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**

Entidad federativa: Estado de México

Clave fiscal 911 15MSU0944F

Planeación

Nombre: Ing. Ana Belén Hernández Castillo
Cargo: Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1040 y 1041
Correo electrónico: ulppe@unevi.edu.mx

RESPONSABLE

Obras y Mantenimiento

Nombre: Lic. Rodrigo Villar Monroy
Cargo: Director Administrativo
Teléfono: 01 728 287 83 82, ext. 1120 y 1121
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fecha ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------|------------|--|----------------------|----------------|---|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|---|---|----------------------|---------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| | | Obras de construcción | Equipamiento | Reparaciones y mejoras | | | | Mantenimiento | Proyecto sustentable | Espacio/equipo | | | | cantidad | metros cuadrados | | | Inicio | Termino | Entrega- Recepción (Acta Inicial) | Acta Administrativa de Entrega- Recepción | Monto de Acta Administrativa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVI Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC | X | | | \$19,046,822.00 | \$19,047,450.07 | \$1,371.93 | Construcción | 1 | 1360.00 | | | 100% | 7/8/2020 | 31/12/2020 | Cabe señalar que se reportó el cumplimiento al 100% de la obra correspondiente a la primera etapa, la cual contempla lo siguiente: Planta baja (1 acceso y vestíbulo, 1 pasillo, 2 laboratorios, 1 sala de cómputo, 1 bodega y 1 núcleo sanitario). Planta alta (3 aulas, 1 oficina de Dirección, 1 sala de juntas, 1 pasillo y 1 núcleo sanitario). En fecha 8 de abril del presente año, la UNEVI realizó el nombramiento total de \$132,242.70 por concepto de rendimientos y remanentes no ejercidos. De lo anterior se desglosa un total: \$132,135.74 de rendimientos generados y \$9,106.96 por concepto de remanente. | SI | N/A | N/A | NO | NO | NA |
| TOTAL | | | | | | | | 1 | 1360.00 | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

MTRA. OLGA PÉREZ SERRABRÍA
RECTORA

[Handwritten signature]

LIC. RODRIGO VILLAR MONROY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados:
OCTUBRE-DICIEMBRE

FECHA DE CORTE: 31/12/2020



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: **Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acclón Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC**



Porcentaje de avance

100%

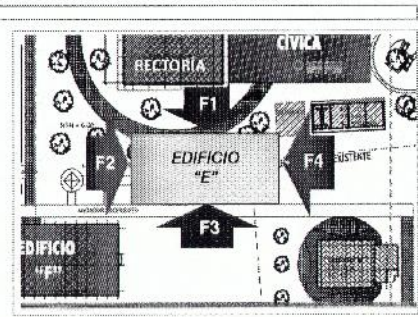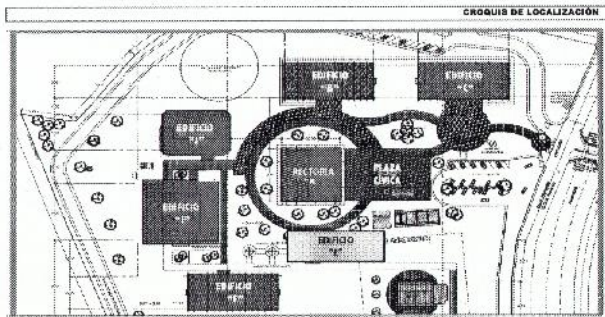


Ubicación de la obra o proyecto

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Iteca, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



FOTOS (1-5)




F1. Fachada principal

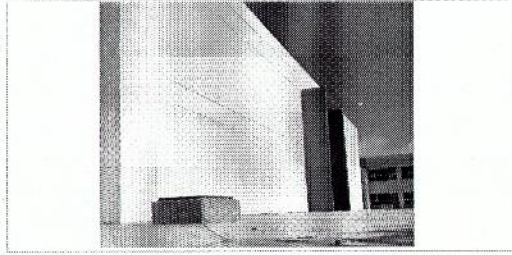


F2. Entrada

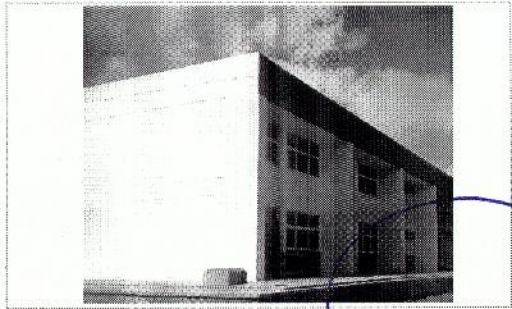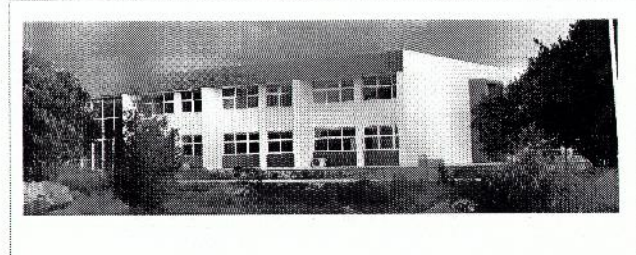

F3. Fachada lateral

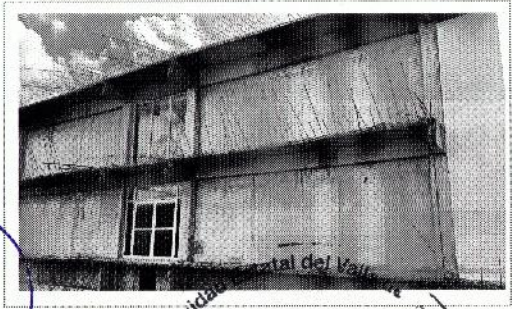

F4. Exterior

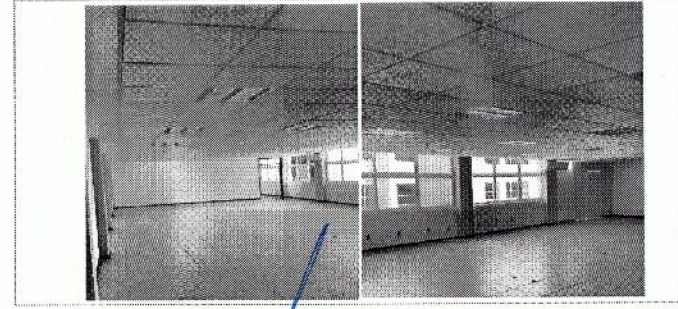

F5. Interior (Laboratorio)

[Handwritten signature]

MTRA. CLARA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

[Handwritten signature]

LIC. RODRIGO VILLAR MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postcard, se podrán copiar tantas postcardas como sea necesario.

Universidad Estatal de Veracruz

QUINTO DEL ESTADO DE MÉXICO

Rectoría

UNEVT | EDOMEX

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados


OCTUBRE-DICIEMBRE

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100%




Nombre de la obra: **Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC**

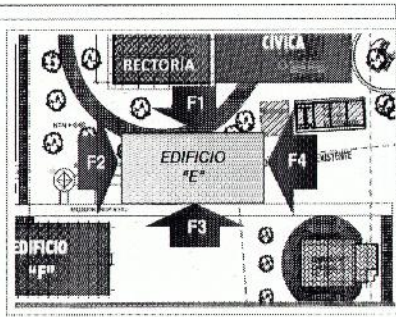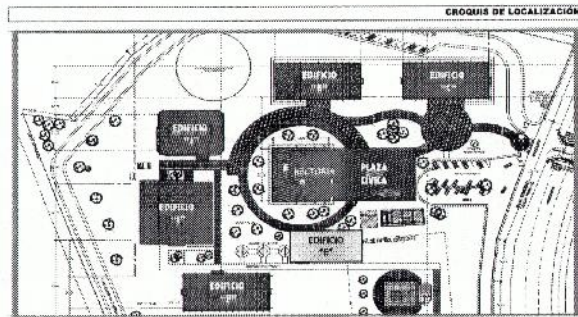

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Ato Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Híralgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756

FOTOS (22)

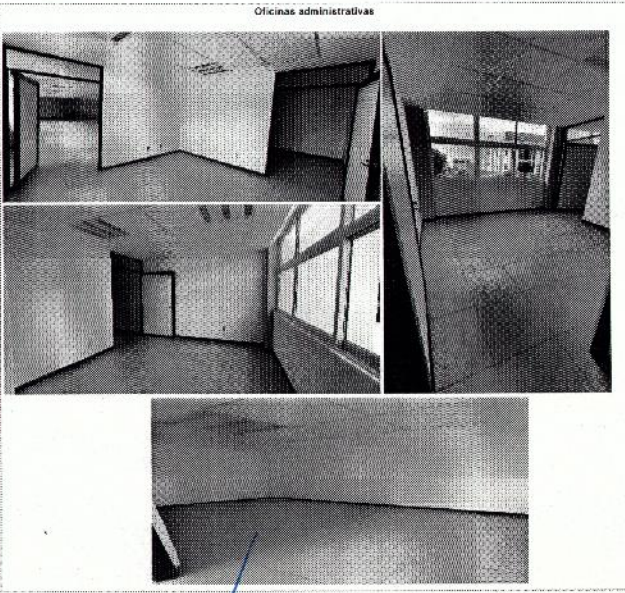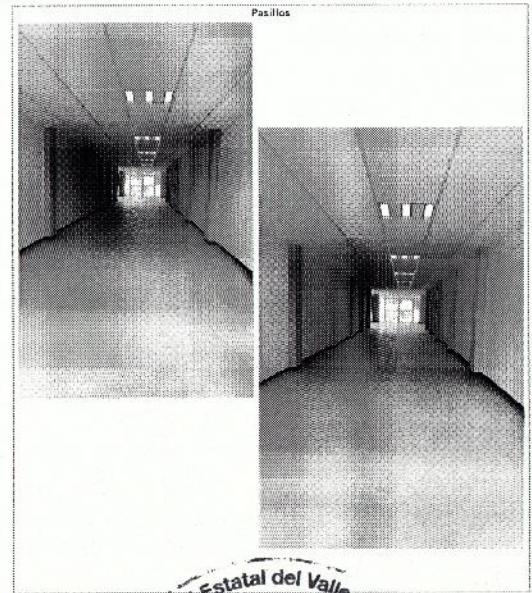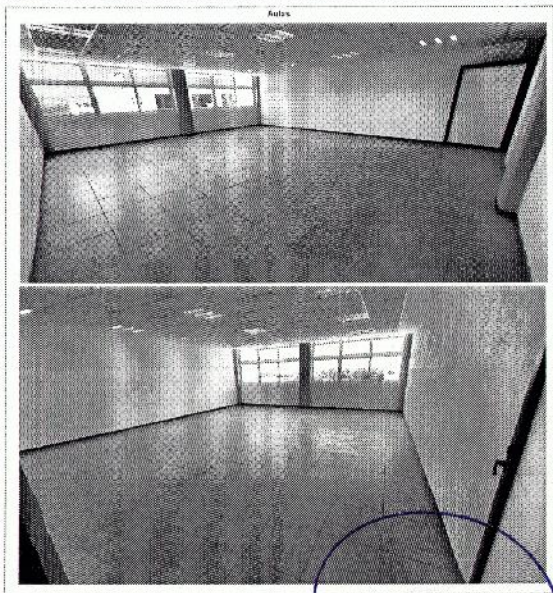

[Signature]
MTRA. OLGA PÉREZ-SANABRIA
RECTORA

[Signature]
LIC. RODRIGO VILLAR MONSIEU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Universidad Estatal del Valle de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Rectoría

UNEVT | EDOMEX
