



ESTADO DE MÉXICO



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

Ocoyoacac, México, a 9 de abril de 2021
Oficio No. 210C3101A000000/187/2021

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado doctor Isaías:

En atención al oficio número 511/2021.-0504-22 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el **primer informe trimestral** (periodo enero-marzo) del reporte de avance físico y financiero de las obras correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, que se enlistan a continuación:

- Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Canchas para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac.

Dicho reporte se envió en formato digital (PDF y Excel) a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted.

CORDIALMENTE

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA



CCP. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.
Dirección de Subsidios a Universidades de la DGESUI.
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT.
Lic. Rodrigo Villa Monroy, Director Administrativo de la UNEVT.
Mtro. Alejandro Esquivel Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros de la UNEVT.
Archivo.
OPS/ABHC/john

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**

Entidad federativa: **Estado de México**

Clave Inst 911: **15MSU0944F**

Planeación
Nombre: **Ing. Ana Belén Hernández Castillo**
Cargo: **Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación**
Teléfono: **01 728 287 83 82 Ext. 1140 y 1141**
Correo electrónico: **uippe@unvt.edu.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: **Lic. Rodrigo Villa Monroy**
Cargo: **Director Administrativo**
Teléfono: **01 728 287 83 82; ext. 1120 y 1121**
Correo electrónico: **direccionadministrativa@unvt.edu.mx**



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas															
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Rehabilitación	Proyecto sustantivo				Espacio	Cubierta	metros cuadrados				Inicio	Termino			Entrega- Recepción (Acta finequito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativo															
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?													
GLOBAL DEL PROYECTO																																					
1	Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac	X					\$ 6,746,880.00	\$ -	\$ -						0%	ND	ND	En proceso de integración de expediente técnico para solicitud de liberación de recursos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
2	Construcción de Canchas para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac	X					\$ 6,435,923.00	\$ -	\$ -						0%	ND	ND	En proceso de suscripción de convenio de colaboración con el IMIFE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
3	Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac	X					2,862,154.74	\$ -	\$ -						0%	ND	ND		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
							TOTAL	0	0																												
							\$15,144,957.74	\$0.00	\$0.00																												

MTRA. **OLGA PÉREZ SANABRIA**
RECTORA

LIC. **RODRIGO VILLA MONROY**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanto filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos digitos: día, mes y año.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

enero-marzo

FECHA DE CIERRE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0%

PROYECTO

1

Nombre de la obra: Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac







CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

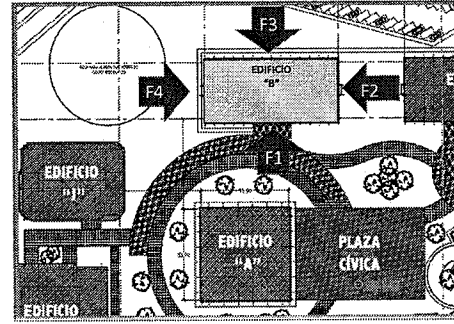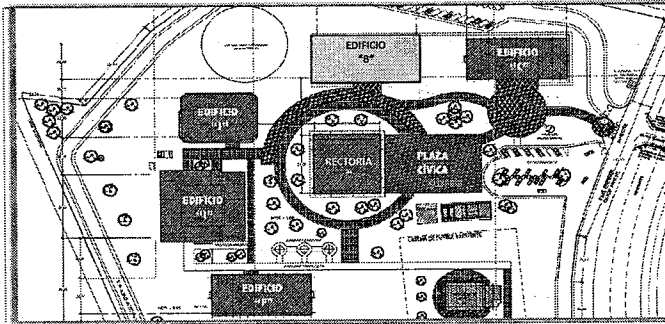

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.

FOTOS



MYRA OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

LIC. RODRIGO VILLA MONROY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRESENCIAS

2

Nombre de la obra: **Construcción de Canchas para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

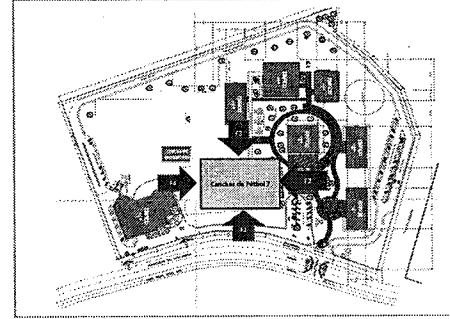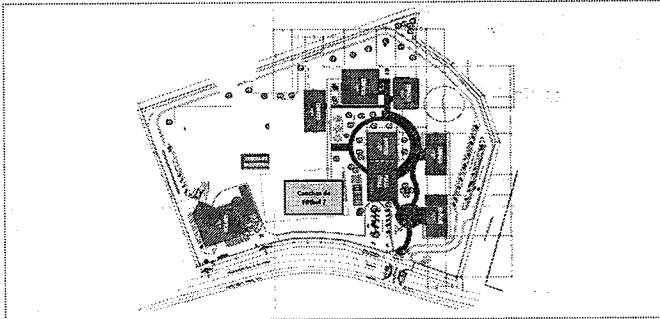

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de
Gusdalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P.
52756.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS






Foto Estación principal

Foto Estación






Foto Fachada posterior

Foto Latero

Foto Interior

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

LIC. RODRIGO VILLA MONROY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

enero-marzo

FECHA DE CONFECCIÓN: 31/03/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PREVIAS

3


Nombre de la obra: **Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

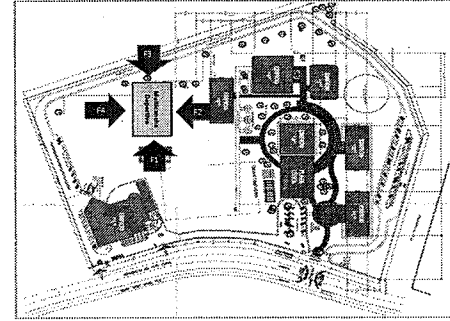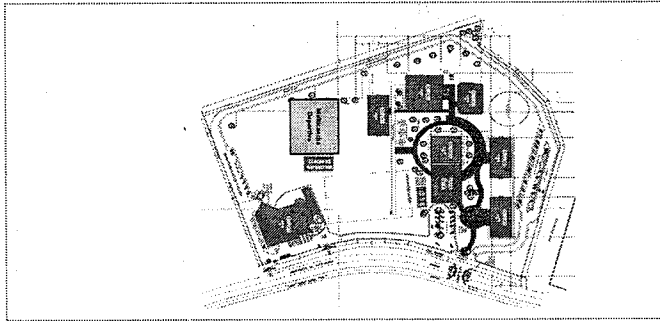

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Acueducto del Alto Larma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance




0%

FOTOS



1. Fachada principal

2. lateral



3. Fachada posterior

4. Exterior

5. Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

LIC. RODRIGO VILLA MONROY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
