



Ocoyoacac, México, a 06 de julio de 2021  
Oficio No. 210C3101A000000/363/2021

**DR. ISAIÁS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**P R E S E N T E**

*Estimado doctor Isaías:*


En atención al oficio número 511/2021.-0504-22 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el **segundo informe trimestral** (periodo abril-junio) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, que se enlistan a continuación:

- Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac.

Dicho reporte se envió en formato digital (PDF y Excel) a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted.

**CORDIALMENTE**

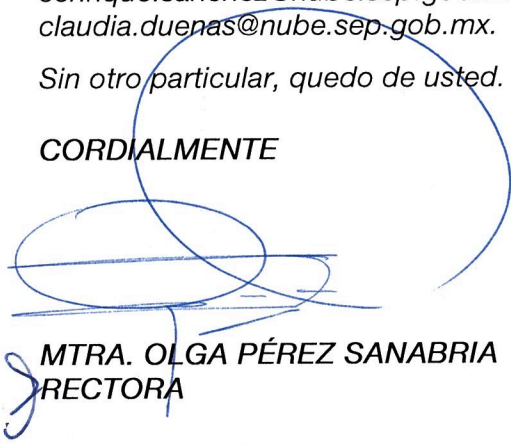

**MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA**  
**RECTORA**



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.  
C.P. Oscar Ortega Cortés, Director de Subsidio a Universidades de la DGESUI.  
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT.  
Lic. Rodrigo Villar Monroy, Director Administrativo de la UNEVT.  
Mtro. Alejandro Esquivel Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros de la UNEVT.  
Archivo.  
OPS/ABHC/jchn

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA**

2021

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE REGISTRO: 04-06-2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0944F

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo  
Cargo: Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1140 y 1141  
Correo electrónico: uippe@unevt.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Lic. Rodrigo Villar Monroy  
Cargo: Director Administrativo  
Teléfono: 01 728 287 83 82, ext. 1120 y 1121  
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Infraestructura y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y dónde inaugurado?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac	x				\$ 6,746,890.00	\$ -	\$ -					0%	N/D	N/D	Los Formatos de Autorización de Pago se encuentran en proceso de pago ante la Caja General de Gobierno.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac	x				\$ 5,435,923.00	\$ -	\$ -					0%	N/D	N/D	Los Formatos de Autorización de Pago se encuentran en proceso de pago ante la Caja General de Gobierno. Asimismo se informa que el Departamento de Convenios Institucionales del IMIFE formalizó la entrega de Convenio de Colaboración número IMIFE/DCI/001/2021 mediante oficio 210C1501010102L034/2021 de fecha 2 de julio de 2021.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac	x				\$ 2,962,154.74	\$ -	\$ -					0%	N/D	N/D	Los Formatos de Autorización de Pago se encuentran en proceso de pago ante la Caja General de Gobierno. Asimismo se informa que el Departamento de Convenios Institucionales del IMIFE formalizó la entrega de Convenio de Colaboración número IMIFE/DCI/002/2021 mediante oficio 210C1501010102L035/2021 de fecha 2 de julio de 2021.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>						\$15,144,967.74	\$0.00	\$0.00	0	0													

*(Handwritten signature)*  
MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

*(Handwritten signature)*  
LIC. RODRIGO VILLAR MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotografico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.



2021

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

abril-junio

FECHA DE DEPÓSITO: 30/05/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra: **Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

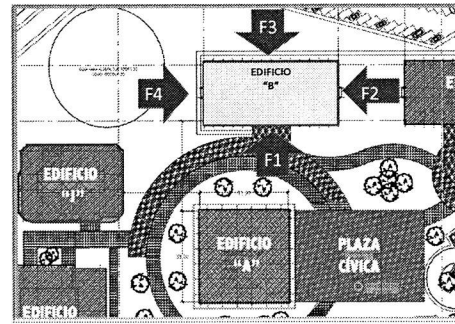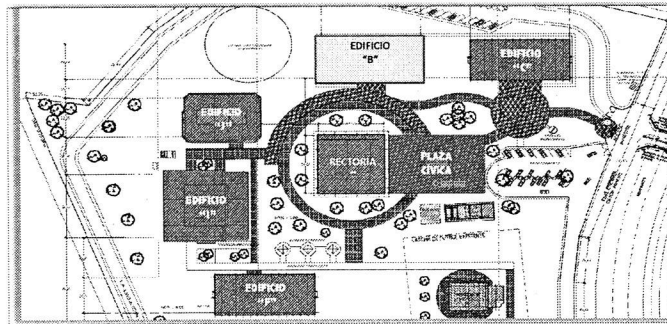

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.




Porcentaje de avance

0%


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

LIC. RODRIGO VILLAR MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2021

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

abril-junio

FECHA DE COPIE: 30/06/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMERA

2


Nombre de la obra: **Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

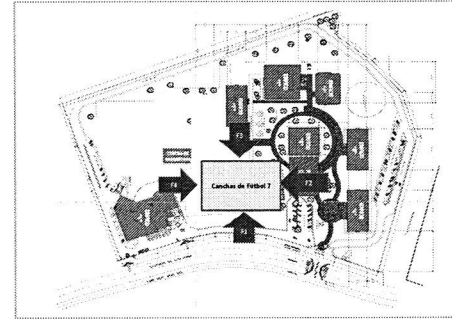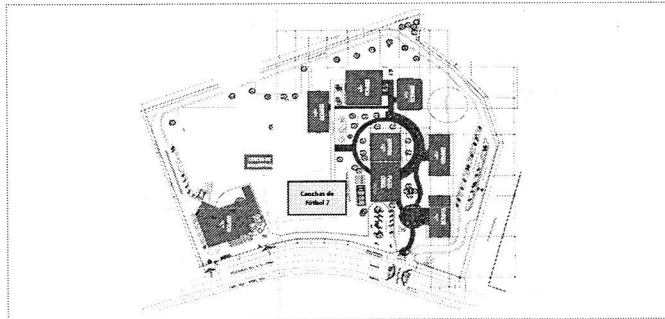

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.




Porcentaje de avance

0%


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

LIC. RODRIGO VILLAR MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.



2021

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

abril-junio

FECHA DE COPIE: 30/06/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRECEDENCIA

3

Nombre de la obra: **Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

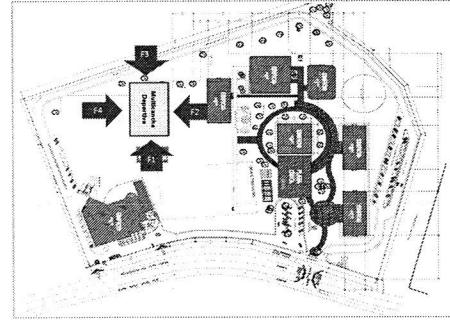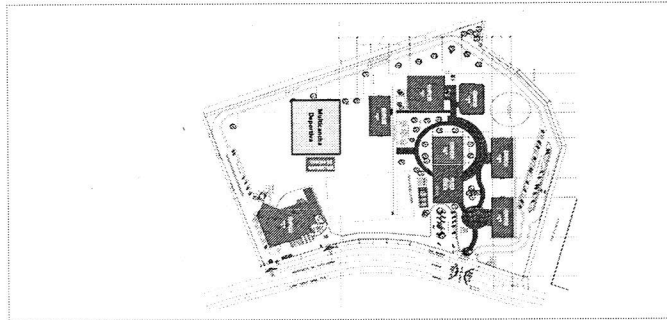

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.




Porcentaje de avance

0%


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

LIC. RODRIGO VILLAR MONROY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
