



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Ocoyoacac, México, a 05 de julio de 2023
Oficio No. 210C3101A000000/556/2023

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado Doctor Rosas:

En atención al oficio número 511/2023-0913-24, de fecha 17 de febrero de 2023, signado por la Doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el segundo informe trimestral (periodo abril – junio) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2023.

Dichos reportes se han enviado en formato digital (PDF y Excel) a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, como se indica en la misiva de referencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Para su conocimiento
Mtra. Blanca Miriam González Garduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT. Para su seguimiento
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT. Para su seguimiento
Archivo.
JERI/ABHC/jchn.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA

Acueducto del Alto Lerma núm. 183, Pedregal de Guadalupe Hidalgo, C.P. 52756, Ocoyoacac, Estado de México.
Teléfono: 728 287 8382 <https://unevt.edomex.gob.mx> rectoria@unevt.edu.mx

2023

FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
COMISION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año en el que se reporta

Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 30/06/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Entidad federativa: Estado de México

Clave 811 15M520647 Clave de la Entidad Federativa: 15

Paralelo

RESPONSABLES

Clave y Matricula

Nombre: Ing. Ana Belen Hernandez Castillo
Cargo: Jefa de la Unidad de Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion
Telefono: 728 267 83 82 Ext. 1142 y 1141
Correo electronico: uppe@unevt.edu.mx

Nombre: Mtra. Blanca Miriam Gonzalez Garcia
Cargo: Encargada de la Direccion Administrativa
Telefono: 728 267 83 82 Ext. 1126 y 1121
Correo electronico: bla.gonzalez@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto ejecutado, Retenimiento, Especificaciones de equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas de inicio y término, Observaciones, Retenimiento en TESCFE, Actas.

Signature of Blanca Miriam Gonzalez Garcia

Signature of Ana Belen Hernandez Castillo

Signature of Jorge Espinosa Rojas

- 1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se puede omitir la foto si no es necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL GOB
CAYOQUO EL REGUNDO

FAM




FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se refiere:
Segundo Trimestre
2023

Fecha de elaboración: 20/05/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0%	1 Nombre de la obra: MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS ACADÉMICOS DE LA UNEVT.		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 	
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	

FOTOS



FOTO BAÑOS BIBLIOTECA PLANTEL OCOYOACAC

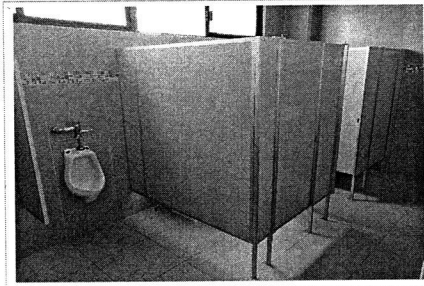


FOTO BAÑOS HOMBRES EDIFICIO RECTORIA UNEVT

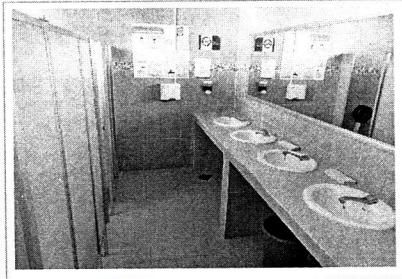


FOTO BAÑOS MUJERES EDIFICIO RECTORIA UNEVT

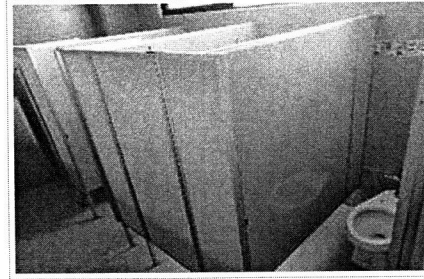



FOTO BAÑOS EDIFICIO "C" ACUPUNTURA PLANTEL OCOYOACAC



FOTO BAÑOS PLANTEL AMANALCO







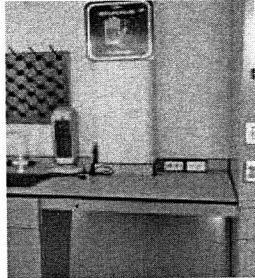






Observaciones:
 Se informa que las fotografías que se se presentan corresponden a las áreas a las que se dará mantenimiento conforme al Proyecto presentado


 BLANCA ESPINOZA ROS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 DANIEL HERNÁNDEZ CASTILLO
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN


 JORGE ESPINOZA ROS
 RECTOR

NOTA
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023 <small>ELABORADA POR EL CUIE OTORGADO EL RECURSO</small>	 FAM <small>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</small>	<small>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERDISCIPLINAR DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Trimestre y año que se reporta:</small> Segundo Trimestre 2023 <small>Fecha de elaboración: 10/06/2023</small>
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL			
 <small>Porcentaje de avance:</small> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">0%</div>	<small>2 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO PARA LA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA, PLANTEL OCOYOACAC.</small> GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  <small>PLANTEL OCOYOACAC</small>	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  <small>Academia del Aire Lerma No. 163 Cda. Pomezoy de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 50700</small>
FOTOS			
 <small>FOTO FACHADA PRINCIPAL CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC</small>	 <small>FOTO LABORATORIOS CIU OCOYOACAC</small>	Observaciones: <small>Se informa que las fotografías que se se presentan corresponden a las áreas que se equipará conforme al Proyecto presentado</small>	
 <small>FOTO LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CIU OCOYOACAC</small>	 <small>FOTO SALA DE ESPERA CIU OCOYOACAC</small>	 <small>FOTO ZONA DE REHABILITACIÓN CIU OCOYOACAC</small>	
 <small>BLANCA MIRYAM COBARRUBIAS ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</small>	 <small>ANA BELÉN RIVERA RIVERA CASTILLO JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</small>	 <small>JORGE ESPINOSA ROS RECTOR</small>	
<small>NOTA</small> * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra			

2023

EJECUCIÓN FISCAL EN EL QUE
GIRÓ EL RECIBO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
**Segundo Trimestre
2023**

Fecha de elaboración: 30/09/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

0%


UBICACIÓN 3

Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO PARA AULAS INTERACTIVAS EN DIVERSAS AULAS DE LA UNEVT.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




PLANTEL OCOYOACAC



PLANTEL AMANALCO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



PLANTEL OCOYOACAC

PLANTEL AMANALCO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Academia del Arte Lomas No. 383 Col. Politécnico Guadalupe Hidalgo, Coyoacán, Estado de México, C.P. 06700



Carrera a Capatzen Vieja No. 51900, Col. Cuernavaca

FOTOS



FOTO AULA EDIFICIO "C" ACUPUNTURA PLANTEL OCOYOACAC



FOTO AULA EDIFICIO PRINCIPAL PLANTEL AMANALCO

Observaciones:

Se informa que las fotografías que se presentan corresponden a las aulas que se equiparán conforme al Proyecto presentado

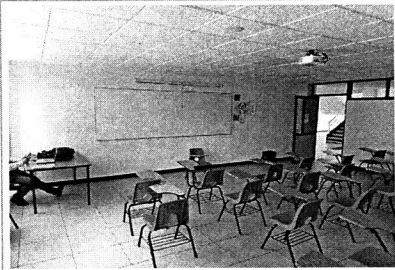


FOTO AULA EDIFICIO ACADÉMICO "F" PLANTEL OCOYOACAC

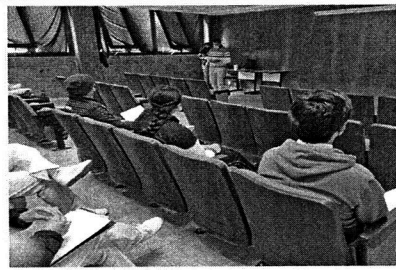


FOTO AUDITORIO PLANTEL AMANALCO

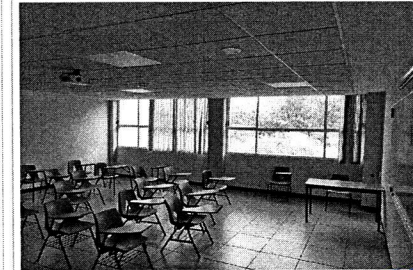


FOTO AULA EDIFICIO ACADÉMICO "F" PLANTEL OCOYOACAC

[Signature]
BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GÁLVEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
ANA BELÉN HERNÁNDEZ CÁDIZ
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

[Signature]
JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Segundo Trimestre
2023

FICHA DE EMERGENCIAS: 00000000

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 UNEVT Porcentaje de avance 0%	4 Nombre de la obra: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNEVT.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  PLANTEL OCOYOACAC PLANTEL AMANALCO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO  PLANTEL OCOYOACAC PLANTEL AMANALCO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  <small>Asamblea de ASES Lateral No. 93, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 0778</small> <small>Calle de Calle Vieja No. 54, PUEBLO DEL DUEÑO AMANALCO</small>
---	---	---	---	---

FOTOS

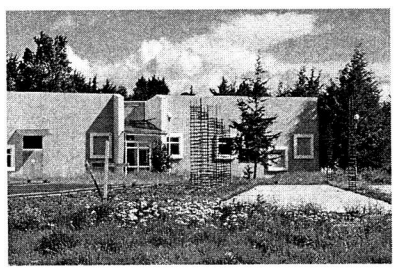


FOTO LAMPARAS LATERAL DE CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA OCOYOACAC



FOTO CAMINO ACCESO A ESTACIONAMIENTOS DOCENTES PLANTEL OCOYOACAC

Observaciones:
 Se informa que las fotografías que se presentan corresponden a los sitios donde se colocarán las luminarias solares conforme al Proyecto presentado.



FOTO FRENTE EDIFICIO LABORATORIOS PLANTEL OCOYOACAC



FOTO FRENTE EDIFICIO "C" ACUPUNTURA PLANTEL OCOYOACAC



FOTO ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PLANTEL OCOYOACAC

[Signature]
 BLANCA MIRAM GONZÁLEZ-SERVINO
 ENCARGADA DE LA BOARDS ADMINISTRATIVA

[Signature]
 ANA BRUCE HERNÁNDEZ CASTILLO
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

[Signature]
 JORGE SEPULCRA ROS
 RECTOR

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM FONDO DE INICIACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LA UNIVERSITARIA E INGENIERIA

Segundo Trimestre 2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD ESTADAL QUI VARE DE Toluca
Carrera: Ingeniería Civil de México

Nombre del Proyecto: EQUIPAMIENTO PARA LA CLINICA INTEGRAL UNIVERSITARIA PLANTEL COYOACAC
Código: 10111866

Nombre del Responsable: JUAN ESPINOSA ROSA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION PARA LA UNIVERSITARIA E INGENIERIA

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Table with columns: Proyecto, Tipo de Proyecto, Monto Autorizado, Fechas Programadas, Monto Ejecutado, Estado de Ejecución, Fechas Revisadas, Observaciones, Estado de Ejecución, Fechas, y Monto Ejecutado. Includes project details for 'EQUIPAMIENTO PARA LA CLINICA INTEGRAL UNIVERSITARIA PLANTEL COYOACAC'.

Signature of Juan Espinosa Rosa

Signature of Juan Espinosa Rosa

Signature of Juan Espinosa Rosa

1. Se declara responsable del contenido de este informe. 2. Se declara responsable de la veracidad de los datos y cifras que se reportan. 3. Se declara responsable de la correcta aplicación de los recursos asignados.

2022

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que ha reportado:

Segundo Trimestre
2023

Fecha de elaboración: 19/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO PARA LA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA, PLANTEL OCOYOACAC.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

FOTOS

ACCESORIOS PARA CONSULTORIO	FOTOS		Observaciones:
			Se informa que las fotografías que se se presentan corresponden al equipo adquirido para la Clínica Integral Universitaria.

EQUIPO ADQUIRIDO PARA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC			EQUIPO ADQUIRIDO PARA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC			EQUIPO ADQUIRIDO PARA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC	

EQUIPO ADQUIRIDO PARA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC	EQUIPO ADQUIRIDO PARA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC	EQUIPO ADQUIRIDO PARA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC
BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ANA BELÉN HERNÁNDEZ CASTIELLO JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	JORGE ESPINOSA RÍOS RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


EFECTUACIÓN FISCAL EN EL CUERPO OTORGADO EL PEDUNCO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERDISCIPLINARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Segundo Trimestre
2023

Fecha de elaboración: 06/05/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


18.84%

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN MULTICANCHAS, PLANTEL OCOYOACAC.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Academia del Alto Loma No. 97, Car. Polanco y Quetzaltenango, Ocoyoacac, Estado de México, C.A. 5776.

FOTOS

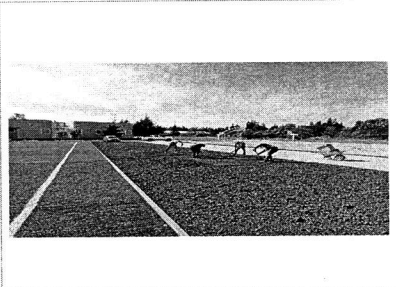

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS




EXCAVACIÓN DE CEPAS

Observaciones:


Se informa que las fotografías que se se presentan corresponden a la obra "Construcción de Arcotecho en Multicanchas, Plantel Ocoyoacac" inconclusa



RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CEPAS



ZAPATA AISLADA Z1



CORTE EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ GARDUÑO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
ANA BELEN FERNÁNDEZ ESPINOSA
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

[Signature]
JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
