



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Ocoyoacac, México, a 10 de enero de 2024
Oficio No. 228C31010000000/33/2024

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
P R E S E N T E

Estimado Doctor Rosas:

En atención al oficio número 511/2023-0913-24, de fecha 17 de febrero de 2023, signado por la Doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el cuarto informe trimestral (periodo octubre -diciembre) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2023.

Respecto a los proyectos apoyados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2022 pendientes de conclusión y con el propósito de dar por concluido el seguimiento administrativo, remito acta de cierre del proyecto Construcción de Arcotecho en Multicanchas, Plantel Ocoyoacac.

Dicha documentación, así como el cuarto informe trimestral se han enviado en formato digital a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, como se indica en la misiva de referencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA RECTORIA
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Designada mediante oficio número 228030011/1295/2023, signado por el Dr. Juvenal Vargas Muñoz, Director General de Educación Superior, de fecha 16 de noviembre de 2023

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Para su conocimiento
Mtra. Blanca Miriam González Garduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT. Para su seguimiento
Mtro. En F. Héctor Nava Contreras - Encargado del Departamento de Recursos Materiales y Financieros. Para su seguimiento
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT. Para su seguimiento
Archivo
BMGG/ABHC



2023 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	 FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Trimestre y año que se reporta Cuarto Trimestre 2023 Fecha de elaboración: 26/10/2023
REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL			
 UNEVT Porcentaje de avance 98%	Nombre de la obra: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNEVT. GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  PLANTEL OCCYOYAC PLANTEL ABAHALLO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO  PLANTEL OCCYOYAC PLANTEL ABAHALLO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Av. General del Ejército Nacional 877 Col. Polanco de Guadalupe México, D.F. México, C.P. 06700 Calle 1 y Calle 10 de Mayo Col. Centro Abasco
 FALDON DE RECTORIA	 FALDON Y POSTES EDIFICIO "C"	 lunes, 8 de enero de 2024 22:05:20 Ciudad de México, México El Pedregal de Guadalupe, México, C.P. 06700 REPORTEANDO SERVICIO ENLACE VIRTUAL	
 FOTO LUMINARIAS SOBRE POSTES ANDADOR EDIFICIO "E" LABORATORIOS	 CIU	 BIBLIOTECA	
 BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ OREJÓN ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 ANA BILEN HERNÁNDEZ CASTIELLO JEFE DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN	 BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ OREJÓN ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DEL VALLE DE TOLUCA (DISPONIBLE MEDIANTE OFICIO AL SEÑOR JEFE DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE FECHA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2023)	
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra			

2023

SERVICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre
2023

Fecha de elaboración: 09/01/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD

PROYECTO

2

NOMBRE DE LA OBRA

EQUIPAMIENTO PARA LA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA, PLANTEL OCOYOACAC.




Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Universidad del Valle de México S.A. de C.V. Plantel de Ocoyoacac, México, Estado de México, C.P. 06710

Observaciones: Conforme a los procedimientos licitatorios del IMIFE, los proveedores participantes no cotizaron equipamiento requerido por la UNEVT.

BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ANA BELÉN HERNÁNDEZ CASTILLO
COORDINADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ENCARGADA DEL SERVICIO DE LICITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA (DESIGNADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 220/2021/17289/2021, SERVIDO POR AL DOCTOR MIGUEL VARGAS BRUNER, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE FECHA 06/11/2021)

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una persona, se podrán tomar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture a misma hora, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y BGA

Trimestre y año que le reporta
Cuarto Trimestre
2023

Fecha de elaboración: 08/10/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Dirección: Carretera Casero de México

Código B1: 01000001 - Casero de México (Facultad II)

Nombre: Ing. Msc. Oscar Hernández Castro
Cargo: jefe de la Unidad de Fortalecimiento, Promoción, Programación y Evaluación
Teléfono: 726 29 83 82 Ext. 1741 y 1747
Correo electrónico: oscar@unevt.edu.mx

Responsable:

Nombre: Mtro. Marco Milton González González
Cargo: Encargado de la Dirección Administrativa
Teléfono: 726 29 83 82 Ext. 1125 y 1123
Correo electrónico: dm@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Table with columns: Proyecto, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado (A), Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto ejecutado (B), Resarcimiento (C)-B-D, Especificaciones técnicas (programas/electrónico), Fechas Revisión, Observaciones, OBRAS CONCLUIDAS (Resumen a la TESOFE, Actas).

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Rafael', 'Rafael', and 'Rafael'.

1. Es copias de... 2. En caso de... 3. El documento...

2023

ESQUEMA FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTEREDUCATIVA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Trimestre y año que se reporta
**Cuarto Trimestre
2023**

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL IMPERIO DE AVANCE TRIMESTRAL

 UNEVT Porcentaje de avance 98%	1 Nombre de la obra MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS ACADÉMICOS DE LA UNEVT.		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		 PLANTE OCTOMACO PLANTE AMANALCO		 Avenida de las Lomas No. 88 Col. Miraflores San Mateo Coahuila, Estado de Coahuila de Zaragoza, México Calle de Castilla No. 1188, Sta. Clara Coahuila

FOTOS

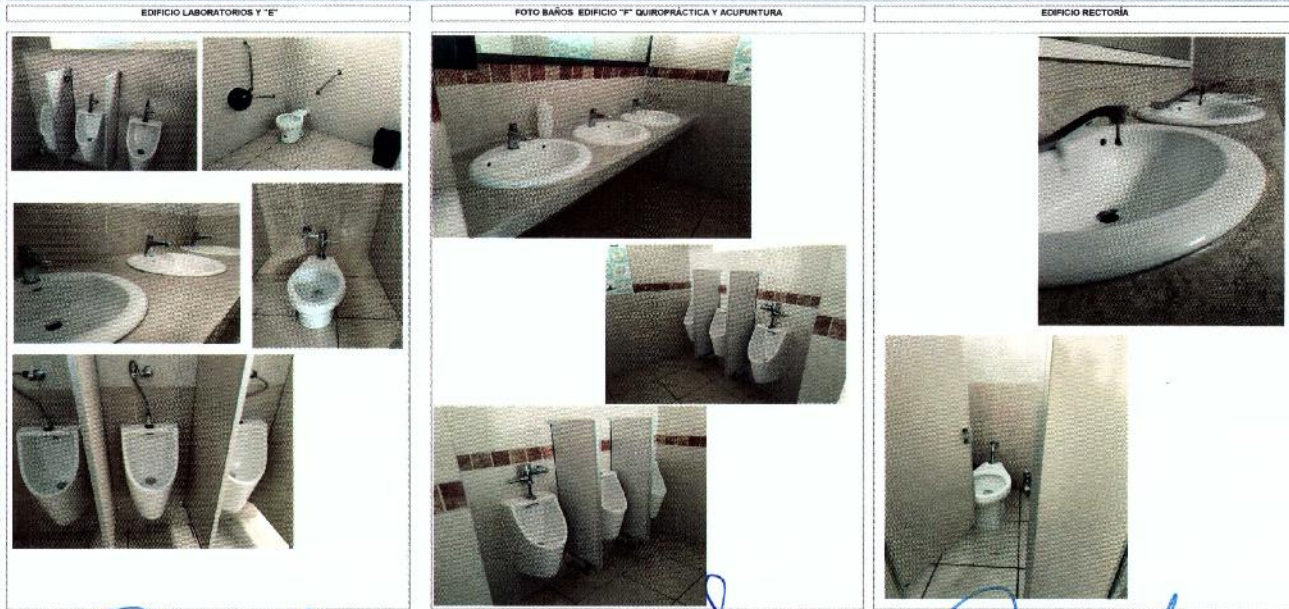









[Signature]
 EDUARDO MORALES GONZÁLEZ CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
 ANIBALEN HERNÁNDEZ CASTILLO
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

[Signature]
 ALONSO RAMÓN GONZÁLEZ GARDUÑO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASISTENTES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE COAHUILA DESIGNADA MEDIANTE ACCO Nº 0001/2023, AUTORIZADO POR EL DOCTOR JUVENAL HERNÁNDEZ GARCÍA TORRES SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIV. ESTADAL DEL VALLE DE COAHUILA

NOTA
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrá copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture a misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2023 <small>EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO</small>	 FAM <small>FONDO DE APORTACIONES NATALES</small>	<small>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Trimestre y año que se reporta</small> Cuarto Trimestre 2023 <small>Fecha de elaboración: 30/01/2024</small>
<small>REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</small>			
<small>LOGO DE LA INSTITUCIÓN</small>  UNEVT <small>Porcentaje de avance</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 50px; margin: 0 auto;">0%</div>	<small>2 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO PARA LA CLÍNICA INTERIOR UNIVERSITARIA, PLANTEL OCCYOACAC.</small>	<small>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</small> 	<small>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</small> 
<small>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</small> 			
<p>Observaciones: Conforme a los procedimientos licitatorios del IMIFE, los proveedores participantes no cotizaron equipamiento requerido por la UNEVT.</p>			
 <small>ALEJANDRA GONZÁLEZ OVARADO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</small>		 <small>ANA BELÉN HERNÁNDEZ CASTILLO JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA Y EVALUACIÓN</small>	 <small>RENATA MIRIAM GONZÁLEZ BARRIOS ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TAPACHULA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 2380000001/2023, SIGNADO POR EL DOCTOR JUVENAL VARGAS RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE FECHA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2023</small>
<small>* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán hacer tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.</small>			

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FERRAMENTAS FÍSICAS

Trimestre y año que se reporta:
Cuarto Trimestre
2023

Fecha de elaboración: 29/12/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

98%

<p>Nombre de la obra: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNEVT.</p>		<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>	
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>		



FALDÓN DE RECTORÍA

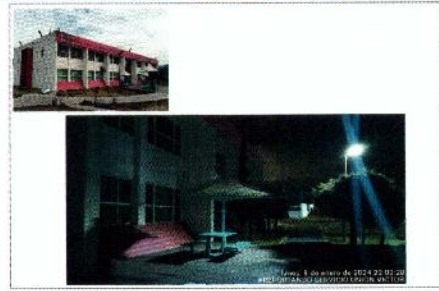

FALDÓN Y POSTES EDIFICIO "C"



Imagen B de fecha de 2024 02 04 23:56:53
Ocoyoacac - Santiago - Tlaxcala
El Prodigio de Guadalupe Huérfano - 52 756
PREFONIA UNO 011 52 55 51 00 00



FOTO LUMINARIAS SOBRE POSTES ANDADOR EDIFICIO "E" LABORATORIOS



BIBLIOTECA

[Signature]
BLANCA MIRIAM PONCELEZ GARCÍA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
JOSÉ HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

[Signature]
BLANCA MIRIAM PONCELEZ GARCÍA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ADJUDICADOS DE LA LICITACIÓN LA UNIDAD HOSPITAL DEL VALLE DE TOLUCA DESIGNADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 129030011193/2023. SIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL VARGAS MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EL DÍA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciónes, en especial se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar que en el anexo, durante y después de la obra.
