



ESTADO DE MÉXICO

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".



Ocoyoacac, México, a 10 de abril de 2023
Oficio No. 210C3101A000000/265/2023

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado Doctor Rosas:

En atención al oficio número 511/2023-0913-24, de fecha 17 de febrero de 2023, signado por la Doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el primer informe trimestral (periodo enero - marzo) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2023, así como reporte de cierre correspondiente al ejercicio 2022.

Dichos reportes se han enviado en formato digital (PDF y Excel) a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, como se indica en la misiva de referencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Para su conocimiento
Lic. Christopher Giovanni Arroyo Olmos, Director Administrativo de la UNEVT. Para su seguimiento
Ing. Ana Beien Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT. Para su seguimiento
Archivo.
JER/ABHC/jchn.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero - marzo

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**

Entidad federativa: **Estado de México**

Clave Inst 911 15MSU0944F

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: **Lc. Christopher Giovanni Arroyo Olmos**

Cargo: **Director Administrativo**

Teléfono: **01 728 287 83 82, ext. 1120 y 1121**

Correo electrónico: **direccionadministrativa@unevt.edu.mx**

Planeación

Nombre: **Ing. Ana Belén Hernández Castillo**

Cargo: **Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación**

Teléfono: **01 728 287 83 82 Ext. 1140 y 1141**

Correo electrónico: **uippe@unevt.edu.mx**



UNEVT

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
1	Mantenimiento a sanitarios de los diversos edificios académicos de la UNEVT.		X			\$ 1,515,865.00	\$ 1,515,865.00					0%	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A			
2	Continuidad de la Construcción Edificio "E" Docencia (Laboratorios), Plantel Ocoyoacac.	X				\$ 10,718,764.00	\$ 10,718,764.00					0%	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A			
3	Equipamiento para aulas interactivas en diversas aulas de la UNEVT.		X			\$ 3,183,116.00	\$ 3,183,116.00					0%	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A			
4	Construcción del Centro de Extensión Universitaria (Clínica Integral Universitaria), Plantel Amanalco.			X		\$ 3,380,160.00	\$ 3,380,160.00					0%	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A			
						TOTAL	0	0																
						\$18,797,905.00	\$0.00	\$18,797,905.00																

Se informa que durante el mes de abril de 2023, se solicitará ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) la autorización para la rectificación de las prioridades 1 y 3, así como la reconducción de los montos autorizados para las prioridades 2 y 4 para la ejecución de nuevos proyectos, lo anterior derivado de las necesidades propias de esta universidad.

JORGE ESPINOSA RÍOS
RECTOR

CHRISTOPHER GIOVANNI ARROYO OLMS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.

2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados:


enero - marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: **Mantenimiento a sanitarios de los diversos edificios académicos de la UNEVT.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

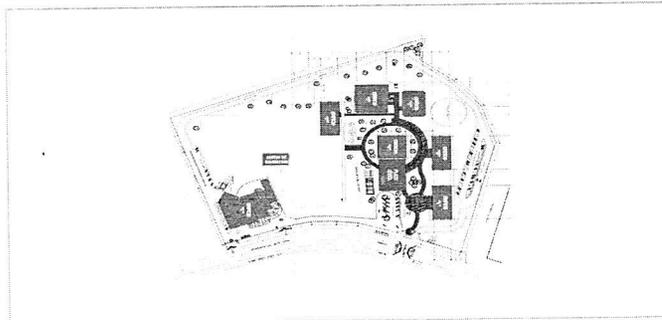

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de Mexico. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

CHRISTOPHER GIOVANNI ARROYO OLMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados:

enero - marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2


Nombre de la obra: **Continuidad de la Construcción Edificio "E" Docencia (Laboratorios), Plantel Ocoyoacac.**



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

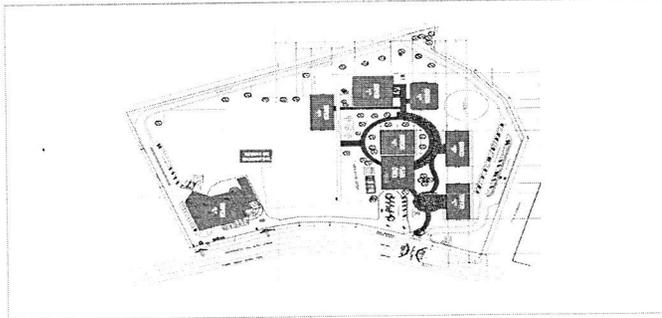


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: lateral



F5: Interior de aula

JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

CHRISTOPHER GIOVANNI ARROYO OLMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados:

enero - marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

ORDEN DE OBRAS

3

Nombre de la obra: **Equipamiento para aulas interactivas en diversas aulas de la UNEVT.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

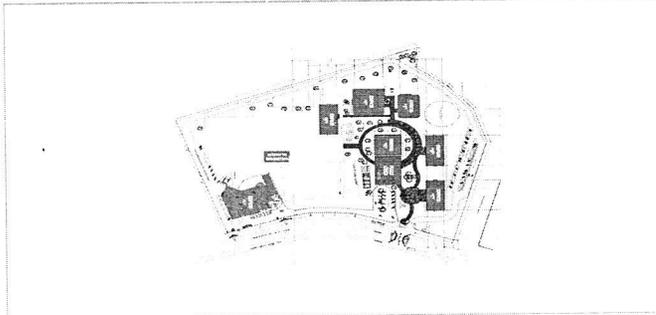

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.




Porcentaje de avance

0%


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

CHRISTOPHER GIOVANNI ARROYO OLMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados:

enero - marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2023


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

4

Nombre de la obra: **Construcción del Centro de Extensión Universitaria (Clínica Integral Universitaria), Plantel Amanalco.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

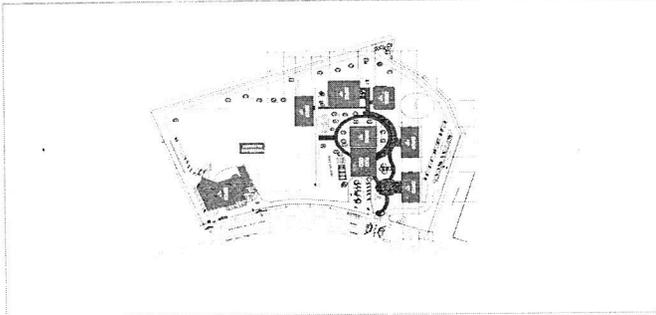

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.




UNEVT


Porcentaje de avance

0%


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

CHRISTOPHER GIOVANNI ARROYO OLMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
