



Gobierno del  
Estado de  
México



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Universidad Estatal del Valle de Toluca  
Rectoría

**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del  
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

Ocoyoacac, México, a 05 de octubre de 2023  
Oficio No. 210C3101A000000/792/2023

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**P R E S E N T E**

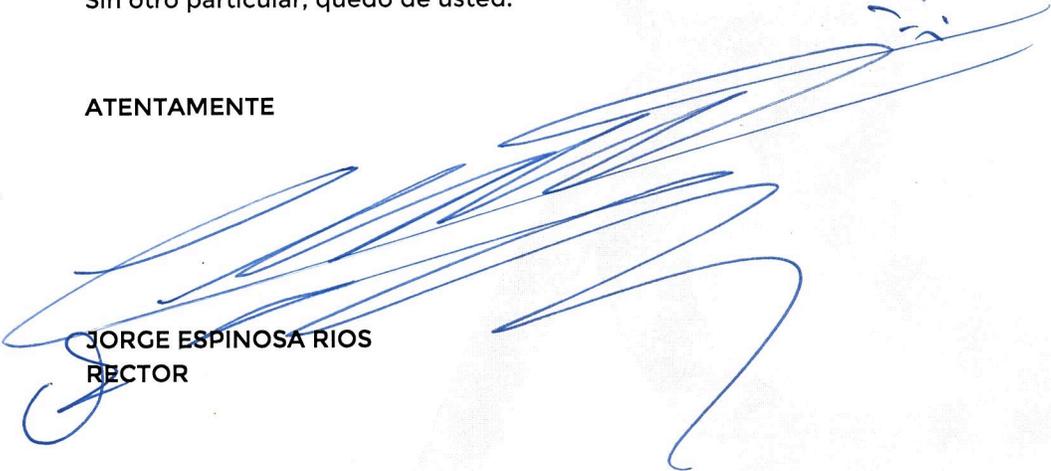
Estimado Doctor Rosas:

En atención al oficio número 511/2023-0913-24, de fecha 17 de febrero de 2023, signado por la Doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el tercer informe trimestral (periodo julio -septiembre) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2023.

Dichos reportes se han enviado en formato digital (PDF y Excel) a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, como se indica en la misiva de referencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**



**JORGE ESPINOSA RIOS**  
**RECTOR**

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Para su conocimiento  
Mtra. Blanca Miriam González Carduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT. Para su seguimiento  
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT. Para su seguimiento  
Archivo.  
JER/ABHC/jchn.



Acueducto del Alto Lerma núm. 183, Pedregal de Guadalupe Hidalgo, C.P. 52756, Ocoyoacac, Estado de México.  
Teléfono: 728 287 8382, [unevt.edomex.gob.mx](http://unevt.edomex.gob.mx), [rectoria@unevt.edu.mx](mailto:rectoria@unevt.edu.mx)

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre

2023

Fecha de elaboración: 29/09/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

ESTADO federativo: Estado de México

Ciudad: Toluca

Calle: 811 1369205497 Calle de la Unidad Federativa 15

Paralelo:

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Blanca Miriam González Garduño

Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa

Teléfono: 728 287 83 82 Ed. 1120 y 1121

Correo electrónico: dradministrativa@unev.edu.mx

Obras y Mantenimiento



Nombre: Ing. Ana Eileen Hernández Castro  
Cargo: Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
Teléfono: 728 287 83 82 Ed. 1145 y 1141  
Correo electrónico: uepa@unev.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan al avance, Fechas Reales, Retiro a la TESOF, Actas.

[Handwritten signature: Blanca Miriam González Garduño]

[Handwritten signature: Ana Eileen Hernández Castro]

[Handwritten signature: Jorge Espinoza Ríos]

1 Se capturará los espacios que sustentan a la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos. (Solo cuando sea necesario).  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa el avance de la obra o proyecto en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
Tercer Trimestre  
2023


Fecha de elaboración: 29/09/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


LOGO DE LA INSTITUCIÓN  UNEVT Porcentaje de avance <b>12%</b>	PROYECTO 1 Nombre de la obra: <b>MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS ACADÉMICOS DE LA UNEVT.</b>		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO				

FOTOS

 <p>FOTO BAÑOS EDIFICIO "F" QUIROPRÁCTICA Y GERONTOLOGÍA</p>	 <p>FOTO BAÑOS EDIFICIO "F" QUIROPRÁCTICA Y GERONTOLOGÍA</p>	Observaciones: Se informa que las fotografías que se se presentan corresponden al avance reportado.
 <p>FOTO BAÑOS EDIFICIO "F" QUIROPRÁCTICA Y GERONTOLOGÍA</p>	 <p>FOTO BAÑOS EDIFICIO "F" QUIROPRÁCTICA Y GERONTOLOGÍA</p>	


\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

<b>2023</b> <small>EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO</small>	 <b>FAM</b> <small>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</small>	<small>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL          DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL          SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Trimestre y año que se reporta</small> <b>Tercer Trimestre 2023</b> <small>Fecha de elaboración: 29/09/2023</small>	
<b>REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</b>				
<small>LOGO DE LA INSTITUCIÓN</small>  <b>UNEVT</b> <small>Porcentaje de avance</small> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;">0%</div>	<small>PRECISAS 2</small> Nombre de la obra <b>EQUIPAMIENTO PARA LA CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA, PLANTEL OCOYOACAC.</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b>  <small>PLANTEL OCOYOACAC</small>	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b>  <small>Acueducto del Alto Loma No. 187, Car. Highway de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 52736</small>
<b>FOTOS</b>				
 <small>FOTO FACHADA PRINCIPAL CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA (CIU) OCOYOACAC</small>	 <small>FOTO LABORATORIOS CIU OCOYOACAC</small>	<b>Observaciones :</b> <small>Se informa que las fotografías que se se presentan corresponden a las áreas que se equipará conforme al Proyecto presentado</small>		
 <small>FOTO LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CIU OCOYOACAC</small>	 <small>FOTO SALA DE ESPERA CIU OCOYOACAC</small>	 <small>FOTO ZONA DE REHABILITACIÓN CIU OCOYOACAC</small>		
 <small>BLANCA PATRICIA ROMÁN MÉNDEZ          ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</small>	 <small>ERICK FERNANDO CASTILLO          JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, INGENIERÍA, PROYECTOS Y EVALUACIÓN</small>	 <small>JORGE ESPINOSA RÍOS          DIRECTOR</small>		
<small><b>NOTA</b></small> <small>* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra</small>				

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE PORTALECIMENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
Tercer Trimestre  
2023

Fecha de elaboración: 29/09/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 LOGO DE LA INSTITUCIÓN UNEVT Porcentaje de avance 0%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO PARA AULAS INTERACTIVAS EN DIVERSAS AULAS DE LA UNEVT.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) 
	PLANTEL OCOYOACAC PLANTEL AMANALCO	PLANTEL OCOYOACAC PLANTEL AMANALCO	Avda. de los Llanos No. 181, Cd. Plantel de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 07740 Centro + Calle Pinar del 8180, Cd. Centro Amanalco	

FOTOS

 <p>FOTO AULA EDIFICIO "C" ACUPUNTURA PLANTEL OCOYOACAC</p>	 <p>FOTO AULA EDIFICIO PRINCIPAL PLANTEL AMANALCO</p>	Observaciones: Se informa que las fotografías que se presentan corresponden a las aulas que se equiparán conforme al Proyecto presentado.
 <p>FOTO AULA EDIFICIO ACADÉMICO "F" PLANTEL OCOYOACAC</p>	 <p>FOTO AUDITORIO PLANTEL AMANALCO</p>	

 ROSA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	 ANA BELEN HERNÁNDEZ CASTILLO JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	 JORGE RODRÍGUEZ ROS DIRECTOR
---	---	--

NOTA:  
 \*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre  
2023

Fecha de elaboración: 29/09/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <b>UNEVT</b> Porcentaje de avance  <b>7%</b>	PRIORIDAD <b>4</b> Nombre de la obra <b>IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNEVT.</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b>  PLANTEL OCOYOACAC      PLANTEL AMANALCO	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b>  PLANTEL OCOYOACAC      PLANTEL AMANALCO	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b>  Alameda del Alto Loma No. 181 C/ra. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 07146 Camino a Calle Viegas SA. 1190. Col. Centro Amanalco
--	---	---	---	---

FOTOS

 FOTO INGRESO Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PLANTEL OCOYOACAC	 FOTO INGRESO Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PLANTEL OCOYOACAC	Observaciones : Se informa que las fotografías que se presentan corresponden al avance que se reporta
 FOTO INGRESO Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PLANTEL OCOYOACAC	 FOTO INGRESO Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PLANTEL OCOYOACAC	

 BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 ANA BELEN HERNANDEZ CASTILLO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	 JORGE ESPINOSA ROJAS ASISTENTE
---	---	--

NOTA:  
 \* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
