



Ocoyoacac, México, a 06 de octubre de 2021  
Oficio No. 210C3101A000000/631/2021

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**P R E S E N T E**

*Estimado doctor Isaías:*

En atención al oficio número 511/2021.-0504-22 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el **tercer informe trimestral** (periodo julio-septiembre) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, que se enlistan a continuación:

- Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac.

Dicho reporte se envió en formato digital (PDF y Excel) a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted.

**CORDIALMENTE**

**MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA**  
**RECTORA**



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.  
C.P. Oscar Ortega Cortés, Director de Subsidio a Universidades de la DGESUI.  
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPE de la UNEVT.  
Mtra. Blanca Miriam González Garduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT.  
Mtro. Alejandro Esquivel Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros de la UNEVT.  
Archivo.  
OPSI/ABHC/jchn

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA





2021

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

julio-septiembre

FECHA DE OBRERÍA: 30/08/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD

1

Nombre de la obra: **Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac**




UNEVT

Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

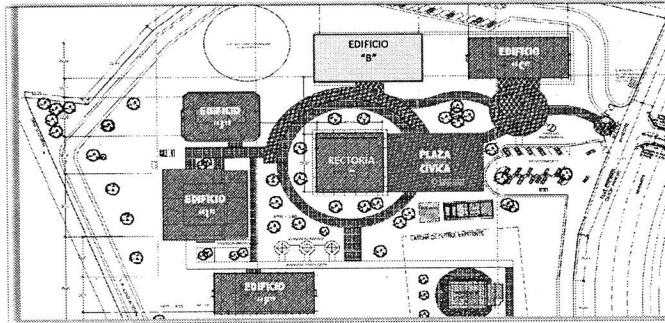


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2021

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

julio-septiembre

FECHA DE COPIE: 2020092021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTOS

2

Nombre de la obra: **Construcción de Canchas para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac**





UNEVT

Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

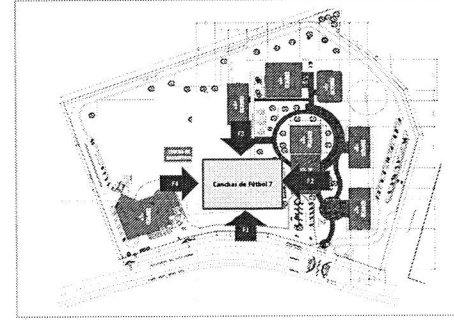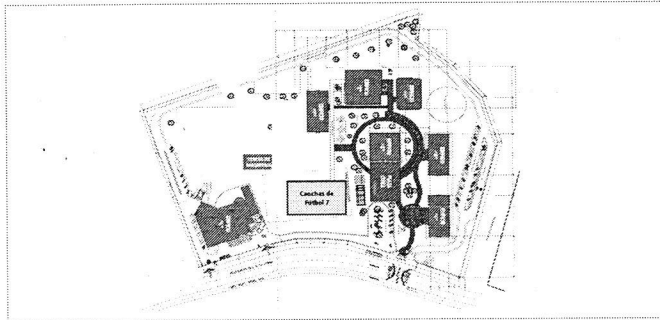


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.


FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de sala

MTRA. OLGA PEREZ SANABRIA  
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.



2021

ARC

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

julio-septiembre

FECHA DE COPÍE: 05/09/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

3


Nombre de la obra: **Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

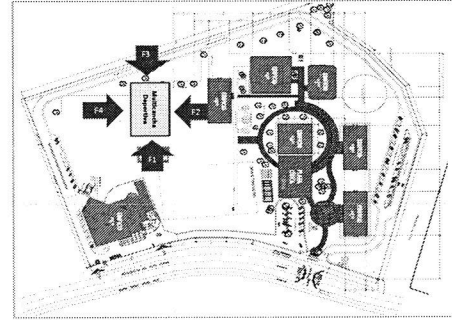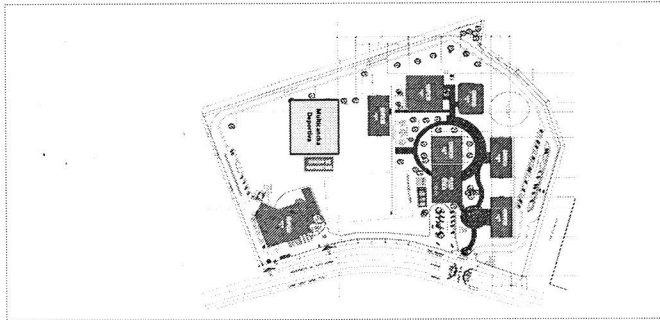

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.




Porcentaje de avance

0%


FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

*[Handwritten signature]*  
MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

*[Handwritten signature]*  
MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
