

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Obras ratificadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del documento **07/09/2016**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	Lic. José Ramón Manzo Vargas		C. Guillermina San Martín Castroparedes	
Universidad Estatal del Valle de Toluca	Cargo:	Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación		Directora Administrativa	
Entidad federativa:	Teléfono:	01 728 287 83 82 Ext. 1040		01 728 287 83 82 ext. 1120	
México	Correo electrónico:	uppe@unsvt.edu.mx		ramonmanzo96@gmail.com	
Clavelnst 911 15ESU0003F				galletassanmartin@hotmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C-PIFI?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra						Justificación en el ProCES o en el ProGES					
						SI	NO	Fecha probable (Favor llenar)		Fecha inaugurada (fecha y funcionario)	SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Monto (pesos s/ctvs.)	Beneficia a más de una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Beneficia a la Gestión						
1	Construcción del Edificio de Rectoría (Segunda Etapa)	\$ 1,196,193.79	\$	756.00	0			NO		X	NO	2014 2015	\$2,854,888.00 \$2,483,278.00			NO	SI	SI	Acupuntura, Gerontología y Quiropráctica	NO			SI		
	<b>Total</b>	1,196,193.79	0.00	756.00																					



*[Handwritten signature]*





ODELACION/ADECUACION																AMPLIACION																																						
Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros				Totales		Aulas/aulas		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otro						
Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Especificar	Núm	M2	Módulo autorizado de FAM para remodelación/adecuación (Módulo-Sub-A)		Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	



*[Handwritten signature]*

Especificar	Totales		
	Núm	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos síchvs.)
	0	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Obras ratificadas

2 en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del documento 04/10/2016

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Planeación</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución:		Lic. José Ramón Manzo Vargas		C. Guillermina San Martín Castroparedes	
Universidad Estatal del Valle de Toluca		Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación		Directora Administrativa	
Entidad federativa: México		01 728 287 83 Ext. 1040		01 728 287 83 ext. 1120	
Clavelnst 811 15ESU0003F		Correo electrónico: <a href="mailto:uippe@unetv.edu.mx">uippe@unetv.edu.mx</a>		<a href="mailto:ramonmanzo86@gmail.com">ramonmanzo86@gmail.com</a>	
				<a href="mailto:galletasamartin@hotmail.com">galletasamartin@hotmail.com</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos síctvs.)	Monto ejercido (pesos síctvs.)	No de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el G.?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra						Justificación en el ProGES o en el ProGES			
						Si	NO		SI	NO	AÑO en que la obra fue apoyada	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos síctvs.)	Beneficia al (beneficia a más de)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatur	Programas Educativos de PAULIC que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado	Beneficia a la Gestión
1	Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría	\$ 1,196,193.79	\$	756.00	0		NO	La Dirección Administrativa está llevando a cabo los trámites necesarios ante el IMIFE para que se lleve a cabo la licitación y adjudicación de dicha obra a una empresa constructora. Una vez que el recurso FAM 2016 por la cantidad de \$1,196,193.79 sea radicado, se llevará a cabo un traspaso del FAM 2014 ya que se obtuvieron rendimientos por \$40,899.72 y remanentes por \$2,035.74; FAM 2015 se obtuvieron rendimientos por \$24,409.80 y remanentes de \$507.09, haciendo un total de \$67,862.35 cantidad que será ejercida con el recurso FAM 2016.	X		2014 2015	\$2,854,888.00 \$2,483,278.00			NO	SI	SI	Acupuntura, Gerontología y Quiropráctica	NO		SI	
<b>Total</b>		1,196,193.79	0.00	756.00																		





MODELACION/ADECUACION																	AMPLIACION																																			
Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos multiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos multiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otr						
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

A. And.

Totales			
Especificar	Num	MZ	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos síctive.)
	0	0.00	0.00

*A. Revuef.*

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Obras ratificadas  
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del documento **07/11/2016**

<b>Información General de la institución</b>	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento
	Nombre	Lic. José Ramón Manzo Vargas		C. Guillermina San Martín Castroparedes
	Universidad Estatal del Valle de Toluca	Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación		Directora Administrativa
	Entidad federativa:	México	01 728 287 83 82 Ext. 1040	01 728 287 83 82, ext. 1120
	ClaveInst 911 1SESU0003F	Correo electrónico	uippe@unevt.edu.mx	ramonmanzo96@gmail.com

Procesos	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACION													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m <sup>2</sup>	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. S?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra						Justificación en el ProCES o en el ProGES				
						Fecha probable (P=avul llenar)	NO	inaugurada (fecha y funcionamiento)		SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	través al (beneficia a más de)	Beneficia solo a una DIES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatur	Programas Educativos de PAVLIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado	Beneficia a la Gestión		
1	Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría	\$ 1,196,193.79	\$	756.00	0			NO	La Dirección Administrativa está llevando a cabo los trámites necesarios ante el IMRF para que se lleve a cabo la licitación y adjudicación de dicha obra a una empresa constructora. Una vez que el recurso FAM 2016 por la cantidad de \$1,196,193.79 sea radicado, se llevará a cabo un traspaso del FAM 2014 ya que se obtuvieron rendimientos por \$40,899.12 y remanentes por \$2,035.74; FAM 2015 se obtuvieron rendimientos por \$24,409.80 y remanentes de \$501.09, haciendo un total de \$67,832.35 cantidad que será ejercida con el recurso FAM 2016.	X		2014, 2015	\$2,854,886.00 \$2,483,278.00				NO	SI	SI	Acupuntura, Gerontología y Guropáctica	NO		SI	
<b>Total</b>		1,196,193.79	0.00	756.00																				

*A. Manzo*





ODELACION/ADECUACION																	AMPLIACION																																					
Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otro						
Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Especificar	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

77  
*[Handwritten signature]*

Totales			
26	Num.	M2	Montto autorizado al FAM para ampliación (pesos Mltvs.)
0		0.00	0.00

*A*

*[Signature]*







MODELO DE DECLARACIÓN													AMPLIACIÓN																																			
Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Aulas/Aulones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otro	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*



Totales			
Especificar	Num.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos saldos)
	0	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Obras ratificadas

en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del documento **09/01/2017**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Planeación</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Responsable Institucional de:		Ing. Cristino Reyes Bandata		C. Guillermo San Martín Castroparedes	
Nombre de la institución:		Nombre		Cargos	
Universidad Estatal del Valle de Toluca		Encargado de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.		Directora Administrativa	
Entidad federativa:		Teléfono		01 726 287 83 ext. 1120	
México		Correo electrónico		galletassanmartin@hotmail.com	
Clavelnst 911 1SESU0003F		01 726 287 83 Ext. 1040		uippe@unevt.edu.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C.?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra								Justificación en el ProDES o en el ProGES	
					SI	NO		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Tránsito al Beneficiario (beneficio a más de una UDEI)	Beneficia a alumnos de DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Postgrado	Programas Educativos de Postgrado		Beneficia a la Gestión
1	Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría	\$ 1,196,193.79	756.00	0	SI	NO	La Dirección Administrativa realizó los trámites ante el IMIFE para que se lleve a cabo la licitación y adjudicación de dicha obra a la empresa constructora Doble T S.A. de C.V., por lo que los trabajos de la obran en referencia han dado inicio.	X	NO	2014-2015	\$2,854,888.00 \$2,483,278.00			NO	SI	SI	Acuñatura, Gerontología y Quirópráctica	NO		SI	
<b>Total</b>		<b>1,196,193.79</b>	<b>0.00</b>	<b>756.00</b>																	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*







Especificar	Totales		
	Núm	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos activos)
	0	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









Totales			
Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos sctes.)
	0	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*









REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																		AMPLIACIÓN																																	
Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros				Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otro		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0



Especificar	Totales		
	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
	0	0.00	0.00

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Obras ratificadas  
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del documento 05/04/2017

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Universidad Estatal del Valle de Toluca	Nombre:	Ing. Cristian Reyes Rendón	C:	Gubernativa San Martín Castropanoos
Entidad federativa:	México	Cargo:	Encargado de la Unidad de Información Planeación Programación e Evaluación	Directorio:	Directora Administrativa
Claveinst 911	16SU0003F	Teléfono:	01 726 267 43 82 ext 1042	Clave:	01 726 267 43 82 ext 1120
		Correo electrónico:	rrreyes@uned.edu.mx	Correo electrónico:	gallegosmmdm@gmail.com

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto ejecutado (pesos a.cta.)	No. de m <sup>2</sup>	Aforo factos	Si se avanza en el 100% y Es una obra sujeción de pago por el C. F. E. C.		Observaciones y causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES u en el ProDES					
					Fecha probable de haberse terminado	NO		Si	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos a.cta.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos a.cta.)	Beneficia a más de una (DE.S)	Beneficia a una (DE.S)	Beneficia a alumnos de 1 <sup>er</sup> y 2 <sup>er</sup> ciclo	Programas Educativos de PAIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Postgrado		Programas Educativos de Postgrado	Beneficia a la Gestión			
1	Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría	\$ 1,196,193.78	756.00	0		NO	El proceso de licitación de la obra "Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría" autorizado por un monto de \$1,196,193.78 (Un millón, ciento noventa y seis mil ciento noventa y tres pesos 78/100 M.N.) ya fue realizado, se cuenta con acta del acto de apertura. De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental el recurso quedó devengado al 31 de diciembre de 2016. Se encuentra en espera de recibir estimaciones para pago.	X	NO	2014-2015	\$2,854,866.00			NO	S	S	Alimentación, Gubernamental y Químicos	NO			S		
	<b>Total</b>	1,196,193.78	0.00	756.00																			





Unid. pes.	Áreas Odológicas		Áreas comunes		Sanitarios		Otras			Totales		Asesoraciones		Talleres		Laboratorios		Cátedras		Bibliotecas		Audiotorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Áreas magras		Áreas usos múltiples		Áreas Odológicas		Áreas comunes		Sanitarios		Otras			Totales		Monto asignado a (FAM para ampliación (pesos activos))
	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Específica	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Específica	Num.	M2					
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Obras ratificadas  
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del documento 09/05/2017

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Universidad Estatal del Valle de Toluca	Responsable institucional de:	Ing. Ciro Roberto Banda	C. Guillermo San Martín Castañero	
Entidad federativa:	México	Nombre:		Directora Administrativa	
Claveinst 911		Cargo:	Encargado de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	07 726 267 83 82 ext. 1126	
15ESU0003F		Teléfono:	01 726 267 83 82 Ext. 1040	galletassanmartin@univalle.com.mx	
		Correo electrónico:	uppe@univalle.com.mx		

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA													JUSTIFICACIÓN									
	Descripción de la obra	Monto ejercido (debe ser en \$)	No. de m <sup>2</sup>	Avance físico	Si el avance es de 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurarse?		Observaciones y causas de demora	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra								Justificación en el ProGES o en el			
					Fecha probable de inicio de la obra	Fecha probable de finalización de la obra		SI	NO	¿Se entregó la obra tal como fue apoyada con recursos del Fondo?	Monto de apoyo con recursos FAM (debe ser en \$)	Nombre del Fondo	Monto (debe ser en \$)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAU/C que se beneficiarán	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas de Posgrado		Beneficia a la Gestión		
	Financiamiento de la Construcción del Edificio de Rectoría	\$ 1,196,163.78	796.00	0	NO	NO	Mediante Convenio Número IMIFE/UAJ/CC/032/2016 y Contrato Número IMIFE 067 CC 2017 se ha dado inicio a los trabajos de la obra del edificio de Rectoría, sin embargo se está en espera de recibir estimaciones para pago	X	NO	2014-2015	\$2,854,668.00	\$7,483,278.90		NO	S	SI	Agricultura, Genética y Quimioterapia	NO		S			
<b>Total</b>		<b>1,196,163.78</b>	<b>0.00</b>	<b>796.00</b>																			

Justificación Académica	Cuenta con el estudio de requisitos de suelos	Se incluye plan de adquisiciones	NÚMERO DE BENEFICIARIOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA OBRA				Denominación económica			MANTENIMIENTO										
			Alumnos			Profesores		Fecha de inicio programada	Fecha de término programada	Fecha de inauguración programada	Funciona o para inaugurar la obra	Localidad, Población y Estado	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad y Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Número Campus	Empresas Generadas		Monto en Bienes y Servicios MO	Monto autorizado TAM para mantenimiento (dólar exacto)	Asistencia		Tareas		Total	
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número			MO	Num	MO	Num		MO
Costeo de los materiales necesarios para el taller de computación	SI	SI	1 MO	0 MC	0 MT	0	0	0	0	0	0	0	0	UNIVERSIDAD LA FERIA DEL VALLE DE GUATEMA	JUNCO	8.2 HECT	1	134,470.00	54.00	7,851,734.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
																	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0						

*[Handwritten signature]*





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 Obras ratificadas  
 en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del documento

08/06/2017

Información General de la Institución		Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	Ing. Cristino Reyes Bandala	C. Guillermina San Martín Castroparedes
Universidad Estatal del Valle de Toluca	Cargo:	Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.	Directora Administrativa.
Entidad federativa:	Teléfono:	01 728 287 83 82 Ext. 1040	01 728 287 83 82, ext. 1120
México	Correo electrónico:	uippe@unevt.edu.mx	gallelassanmartin@hotmail.com
Clavelnst 911 15ESU0003F			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES					
					SI	NO	Fecha probable (Favor llenar formato)		Fecha probable (Favor llenar formato)	SI	NO	¿En qué año la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cts)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado	Beneficia a la Gestión	
1	Finalización de la Construcción del Edificio de Rectoría	\$ 1,196,193.79	\$ 432,119.69	756.00	40%		NO			X	NO	2014, 2015	\$2,854,888.00 \$2,483,278.00			NO	SI	SI	Acupuntura, Gerontología y Quiropráctica	NO		SI		
	Total	1,196,193.79	432,119.69	756.00																				





													AMPLIACIÓN																																					
Usos pies		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctve.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctve.)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00				



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO




GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**



UNEVT

*MEMORIA FOTOGRÁFICA OBRAS FAM UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE  
TOLUCA*

OBRAS FAM 2014 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RECTORÍA" AVANCE  
FISICO: 100%

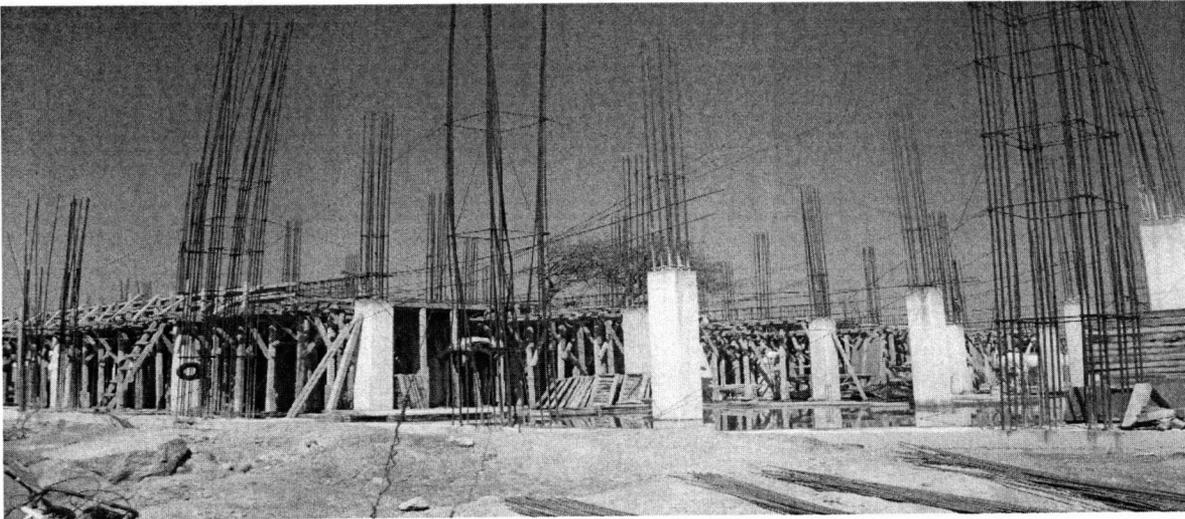

OBRAS FAM 2015 "CONSTRUCCIÓN DE LA FINALIZACION DEL EDIFICIO DE  
RECTORÍA 1RA ETAPA" AVANCE FISICO: 100%



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Acueducto del Alto Lerma No.183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. CP. 52756.  
Tels.: (01728) 2 87 83 82 y 2 87 79 22

[www.edomex.gob.mx/unevt](http://www.edomex.gob.mx/unevt)

[unevt@edomex.gob.mx](mailto:unevt@edomex.gob.mx)




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**G**  
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**



OBRAS FAM 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA FINALIZACION DEL EDIFICIO DE RECTORÍA"

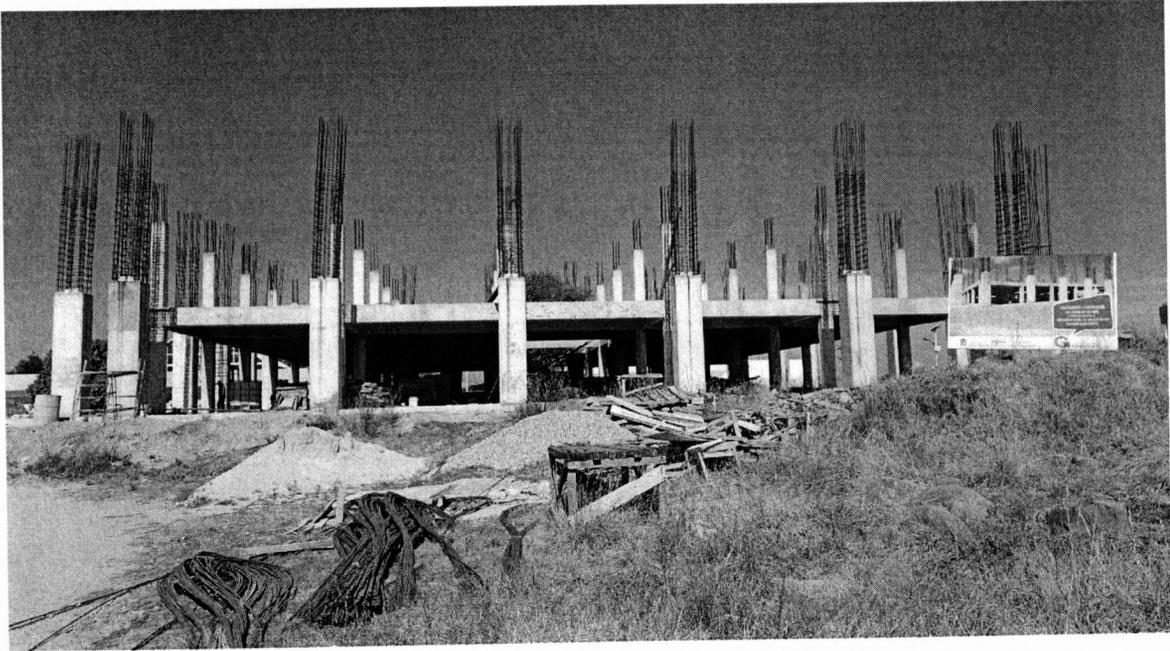

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA

Acueducto del Alto Lerma No.183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México, CP. 52756.  
Tels.: (01728) 2 87 83 82 y 2 87 79 22  
[www.edomex.gob.mx/unevt](http://www.edomex.gob.mx/unevt) [unevt@edomex.gob.mx](mailto:unevt@edomex.gob.mx)
