



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

Ocoyoacac, México, a 04 de julio de 2019  
Oficio No. 210C3101A000000/592/2019

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
P R E S E N T E



Por este conducto, me permito remitir a usted un CD, con los formatos de reporte de avance físico y financiero del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 y 2019, correspondiente al mes de junio del presente año.

No omito mencionar, que dichos reportes se enviaron en formato digital a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx; anexando dos archivos (PDF y Excel).

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

*[Handwritten signature]*  
MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA



C.c.p. Dra. Carmen Eneida Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.  
Lic. Jaime Chapa Benítez. - Director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP.  
C. Gloria Pedraza González. - Directora Administrativa de la UNEVT.  
Ing. Ana Beilen Hernández González Garduño. - Encargada de la UIPPE de la UNEVT.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado  
**JUNIO 2019**  
FECHA DE DEPÓSITO: 29/06/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**  
Entidad federativa: Estado de México  
Clave Inst 911: 15MSU094F



Planeación  
Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo  
Cargo: Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1040 y 1041  
Correo electrónico: uppe@uneuv.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento  
Nombre: C. Gloria Pedrozo González  
Cargo: Directora Administrativa  
Teléfono: 01 728 287 83 82, ext. 1120 y 1121  
Correo electrónico: direccionadministrativa@uneuv.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obras de construcción	Equipamiento	Reparaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto subvencionable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta linkouts)
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																						
1	Proyecto de equipamiento para espacios educativos, laboratorios y de la clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	X				\$ 6,427,738.18	\$ -	\$ -	Aulas/salones	42	8400 m2				0%	N/D	N/D	Mediante el Oficio No. 20704000L-APAD-0406/19 de fecha 31 de mayo del presente, se autorizó la asignación correspondiente al FAM 2019 por la cantidad de \$16,716,373.67, así mismo estamos en espera de la validación del Formato de Autorización de Pago, para la ministración del recurso.				
									Auditorios	2	400 m2											
									Aulas interactivas	8	1600 m2											
									Aula de usos múltiples	8	1600 m2											
									Aulas magnas	1	200 m2											
									Laboratorios	2	400 m2											
									Aulas/salones	2	400 m2											
									Talleres	2	400 m2											
									Laboratorios	2	400 m2											
									Auditorios	1	200 m2											
2	Proyecto de adecuaciones y mejoramiento de espacios teórico-prácticos de la Universidad, que contribuya a optimizar y potencializar su funcionamiento.	X				\$ 5,445,640.47	\$ -	\$ -	Aulas magnas	1	200 m2				0%	N/D	N/D					
									Áreas comunes	1	600 m2											
3	Proyecto de mantenimiento institucional en espacios educativos, laboratorios y de clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	X				\$ 4,842,995.02	\$ -	\$ -	Espacios educativos, laboratorios, clínica integral		28000 m2				0%	N/D	N/D					
						<b>\$16,716,373.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>														

*[Handwritten signature and stamp of Mtra. Olga Pérez Sanabria]*

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

*[Handwritten signature and stamp of C. Gloria Pedrozo González]*

C. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes Reporte de  
**JUNIO 2019**  
FECHA DE CORTE: 28/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



1 Nombre del proyecto: **Equipamiento para espacios educativos, laboratorios y de la clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.**



Porcentaje de avances

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183. Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.

FOTOS




AULAS

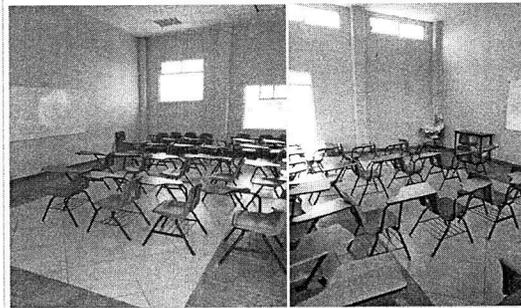


LABORATORIO MULTISENSORIAL




PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA (CIU, EDIFICIO "C" Y "F")

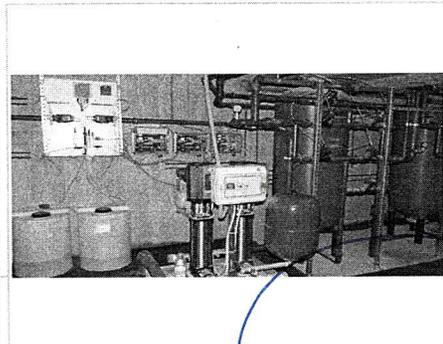

SISTEMA ELÉCTRICO EN CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA

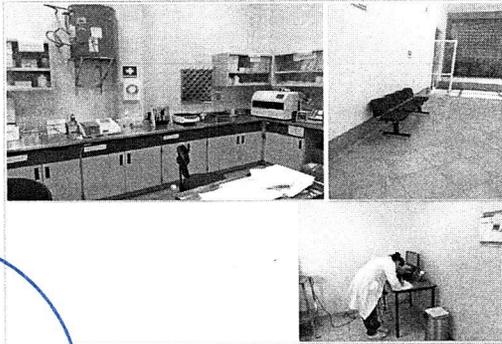

LABORATORIO CLÍNICO

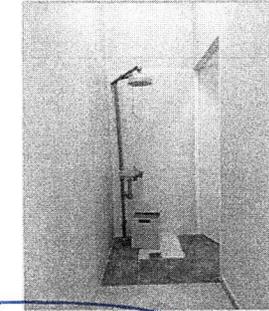

REGADERA DE EMERGENCIA EN CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

C. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportarbo  
**JUNIO\_2019**  
FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0%


PROYECTO: 2 Nombre del proyecto:

Adecuaciones y mejoramiento de espacios teórico-prácticos de la Universidad, que contribuya a optimizar y potenciar su funcionamiento.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

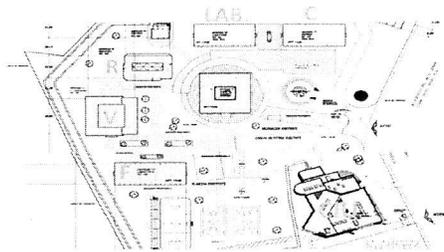


CIU




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de Mexico. C.P. 52756.


FOTOS

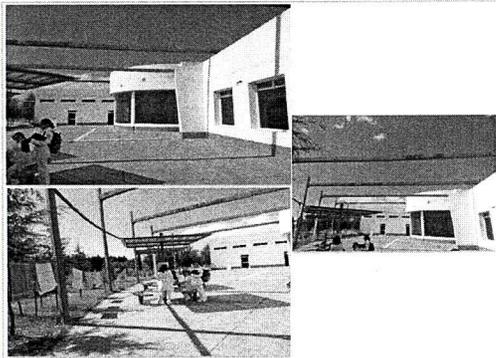


ADECUACION DE ÁREA DE QI-GONG




LABORATORIO DE ESTIMULACIÓN TUI-NA MULTISENSORIAL

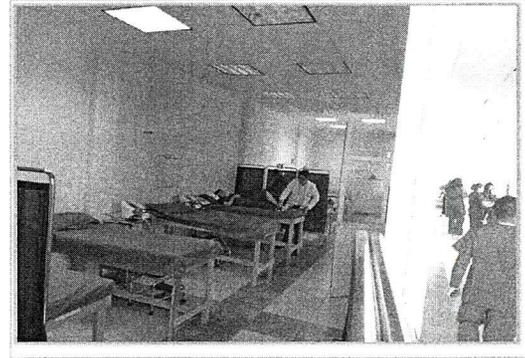


ÁREA DE ELECTRO-ACUPUNTURA

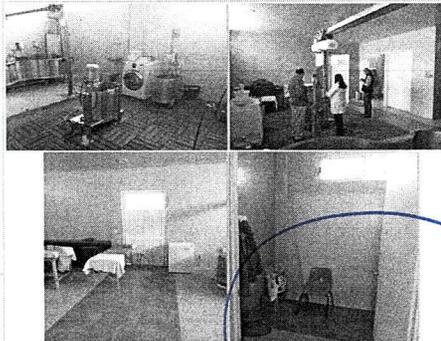

ÁREA DE HIDROTERAPIA

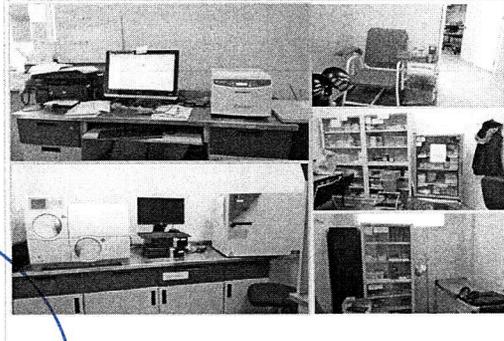

LABORATORIO CLÍNICO

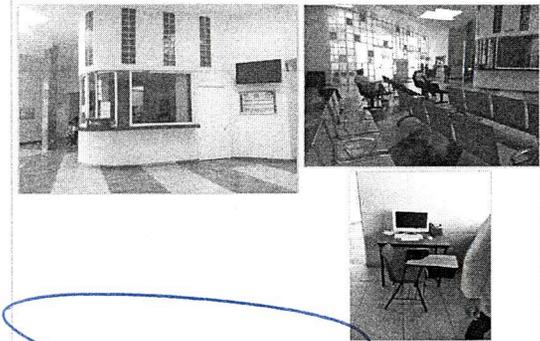

ÁREA DE ESPERA Y ADMISIÓN

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

C. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

ARG

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**JUNIO\_2019**

FECHA DE CORTE: 31/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



3 Nombre de los proyectos: **Mantenimiento institucional en espacios educativos, laboratorios y de clínica integral universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.**



Porcentaje de avance

**0%**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183. Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.


FOTOS

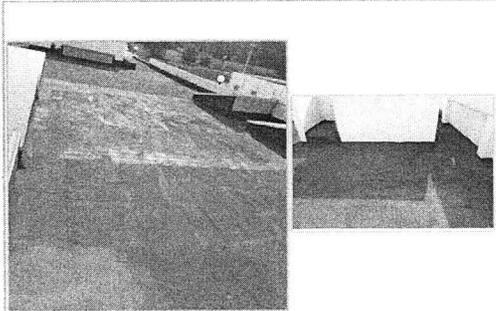


Impermeabilización (techo de la CIU)

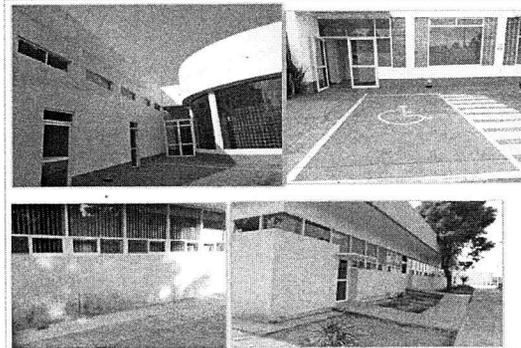


Trabajos de Pintura (CIU) y edificio de Vinculación Interior y exterior)

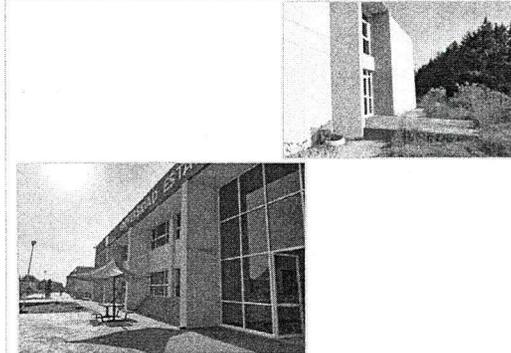

Trabajos de Pintura (edificio "C" y "F")

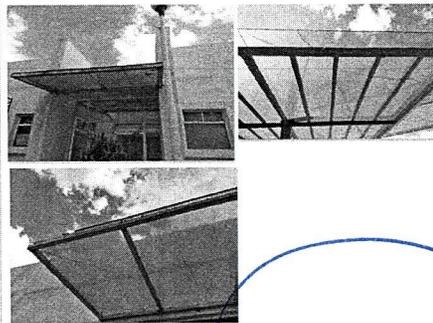

MANTENIMIENTO A CANCELERÍA EN CIU

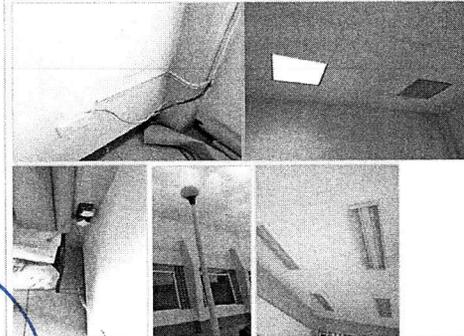

Instalación eléctrica e Iluminación (Edificios "C", "F", Vinculación, Laboratorios, Biblioteca)

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA  
RECTORA

C. GLORIA PEDROSO GONZÁLEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
